

## KISTÉRSÉGI START munkaprogram

### BELVÍZELVEZETÉS

Program-elem

### 2013. évi BESZÁMOLÓJA

#### Projekt leírása:

Mederlapozást az alábbi utcákon tervezzük: Városkert utca, Rákóczi krt., Hunyadi utca, Kurucz utca, Dohánybevaltó utca. Összesen: 3064 fm.

Új árok kialakítása és mederlapozása: Rózsa utcán, Gyep utcán 650 fm. Mindösszesen kb:3.700 fm nyitott, földmedrű árok mederlapozása, 956 m lefedett átereszt kitakarítása, járdák javítása, igazítása.

A mederlapozáshoz kb 28.000 db mederlap legyártása szükséges.

Támfalakat készülnek az újonnan lerakott, használt átereszek felhasználásával. A mederlapok elhelyezése után koszorúval összekötésre kerülnek.

Javításnál felszedésre kerülnek a mederlapok, földmeder igazítása után újra beépítésre.

Fű kaszálása, parlagfű irtása fontos feladat Hajdúdorog-Hajdúnánás kerékpárúton, EU parkban, Böszörményi úton. Zöldhulladék összegyűjtésre, komposztáló telepre szállítása.

#### Létszám megbontása:

- 1 fő munkavezető az egész program irányításáért felelős
- 1 fő adminisztrátor a különböző nyilvántartások, kimutatások készítése,
- 2 fő telepőr-portás (a másik 2 főt az értékteremtő projekt adja, mivel egy a telephely a két csoportnak)
- 1 fő csoportvezető, kőműves szakmunkás mederépítő, mederlapozó csoport
- 10 fő segédmunkás
- 1 fő csoportvezető, kőműves szakmunkás földmedrű árkokat készítő csoport
- 10 fő segédmunkás
- 10 fő meder-tisztító csoport

Többszöri átdolgozás és egyeztetés után 2013. március 05. napján Önkormányzatunk beadott kérelmére a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúnánási Járási Hivatal I. Járási Munkaügyi Kirendeltségével **IX-M-006/5026-3/2013-0905** iktatószámon **36 főre**, mindösszesen **41.261.017.-Ft** vissza nem térítendő céltámogatásra kötöttünk hatósági szerződést az alábbiak szerint:

|   |                        |
|---|------------------------|
| 36 fő közfoglalkoztatási bére:              | 27.861.054.-Ft         |
| 26 fő közfoglalkoztatási bér utáni járulék: | 3.761.242.-Ft          |
| Béreköltség összesen:                       | 31.622.296.-Ft         |
| Beruházási és dologi kiadások költségei:    | 9.638.721.-Ft          |
| Támogatás teljes időtartamára kifizethető:  | 41.261.017.-Ft         |
| Támogatás teljes időtartama:                | 2013.03.05-2013.12.31. |
| Kifizetett előleg:                          |                        |
| Közfoglalkoztatottak béreköltsége:          | 6.385.270.-Ft          |
| Beruházási és dologi költségek:             | 6.747.105.-Ft          |

A munkavégzés 18 fővel indult március elején és április 4. napjára értük el a projektben tervezett 36 fős létszámot.

2013-ban a közfoglalkoztatás keretében megkezdődött a város belvízelvezetésének rendbetétele, a várost körülvevő csatornák, árkok kialakítása. Kezdetben a zord időjárás okozta károk enyhítésén és a 2013. március 15-i hóesés következményein dolgoztunk.

2013. március hónapban vízszivattyúzást végeztünk a lehullott nagymennyiségű csapadék miatt az alábbi területeken:

- Húsfeldolgozó környékén,
- Agyag u. – Hétút u.,
- Kukuca temető,
- Böszörményi u.,
- EU Park – Gyepszél u.
- Rákóczi kert

A vízszivattyúzás több napon keresztül történt napi 8 órában.

A szivattyúzások alkalmával elhasznált üzemanyag mennyisége 45 liter.

A meglevő áttereszek folyamatos tisztítása, illetve új áttereszek létrehozása, árkok, csatornák gaztalanítása, kaszálása, rézsű kialakítása folyamatos feladat volt egész évben.

„El, vagy lesüllyedt” átteresz gyűrűk eredeti állapotának visszaállítása:

- Böszörményi u.
- Tokaji u. /Polgármesteri Hivatal/
- Füzes u.
- Nyíregyházi u.

Az áttereszek kialakításánál új - régi beton gyűrűk kerültek felhasználásra, illetve beépítésre a régi használható betongyűrűk beszállítása telephelyünkre megtörtént későbbi esetleges felhasználás céljából. A lehelyezett betongyűrűknél a támfalak elkészítése, illetve betonnal való beöntése folyamatosan megtörtént.

- Hétút u.,
- Kút u.
- Toborzó u.

Vízgyűjtő aknák takarítása, iszapmentesítése több alkalommal megtörtént az év folyamán:

- Sarok u.
- Böszörményi u.
- Mátyás krt.
- Ady E. krt.
- Bocskai krt.
- Rákóczi krt.

Az itt keletkezett iszapréteg, illetve egyéb hulladék-anyag elszállításáról folyamatosan gondoskodtunk.

Az előre tervezett új árok kialakítása, illetve mederlapozása a Rózsa utcán, illetve a Gyep utcán szakhatósági engedély hiánya miatt elmaradt, de helyette szikkasztó, illetve vízelvezető árok került kialakításra összesen 400 méter hosszúságban az alábbi utcákon:

- Régi tokjai u. 50 m.
- Ady E. u. 50 m.
- Nagy S. u. 100 m.
- Tokaji u. 50 m.
- Kút u. 100 m.

Vízvezető árkok, illetve áttereszgyűrűk folyamatos takarítása, illetve a járdákról és az úttestről való vízvezetés érdekében az útpadka kialakítása összesen 53 utcában többször is megtörtént a „Belvízelvezetés - Projekt” ideje alatt, amely 2013. március 05-től – 2013. december 31-ig tartott. Az elvégzett munkánkat tételesen havi megbontásban vezetett munkanapló tartalmazza. Megtisztított folyóméter mindösszesen: 33.310 fm (tételes felsorolást a beszámoló 1. sz. mellékletében).

2013-ban a Városkert u., Rákóczi krt., Hunyadi u., Kurucz u., Dohánybeváltó u. földmedrű vízvezető árkok mederlapozását terveztük, de egyéb okok miatt ennek megvalósítása nem történt meg, helyette a következő utcák mederlapok igazítása, illetve teljes árokrendszer mederlapozása történt meg, az alábbi utcákon:

| Utca nevek           | Javított<br>hosszúság (m) | Beépített<br>mederlap (db) |
|----------------------|---------------------------|----------------------------|
| Böszörményi          | 215                       | 100                        |
| Ady Endre            | 85                        | 120                        |
| Füzes                | 250                       | 650                        |
| Méntelep             | 150                       | 75                         |
| Régi Tokaji          | 270                       | 80                         |
| Nyíl                 | 1210                      | 500                        |
| Mester               | 410                       | 125                        |
| Árpád                | 1685                      | 550                        |
| Jaczkovics           | 310                       | 150                        |
| Tokaji               | 290                       | 175                        |
| Iskola               | 105                       | 50                         |
| Fogadó               | 360                       | 550                        |
| Petőfi Sándor        | 595                       | 75                         |
| Akácfa               | 65                        | 40                         |
| Toborzó              | 180                       | 80                         |
| <b>Mindösszesen:</b> | <b>6180</b>               | <b>3320</b>                |

Vízvezető árok, illetve csatorna többszöri takarítása megtörtént teljes hosszban az Agyag utcai zsiliptól a Kukuca temető mögötti vízvezető csatornáig.

A vízvezető árkok, illetve csatornák takarítása során keletkezett gaz, szemét, iszaphordalék és egyéb anyagok elszállításáról folyamatosan gondoskodtunk.

- A Tokaji úton, illetve a Gyepszél úton a nádas több alkalommal levágásra került.

Parlagfű irtásáról folyamatosan gondoskodtunk az egész év folyamán, kiemelten: 2013. május 13 – 17. közötti időszak,

(Hn-Kerékpárút, Tokaji úti kerékpár út, Böszörményi út) összesen: 2950 m<sup>2</sup>

2013. június 24 – 26. közötti időszak,

(Zsidó-Köztemető-EU Park, Tokaji út) Össz: 48250 m<sup>2</sup>

2013. július 22 – 26. közötti időszak.

(Lókert, Rákóczi kert, Lőtér, Méntelep út – Köz.ig.ter.) összesen: 48.250 m<sup>2</sup>

Az év folyamán a város zöld területeinek kaszálása folyamatosan történt az alábbi területeken:

- Méntelep úti önkormányzati terület,
- Böszörményi út mindkét oldala,
- Tokaji, illetve Nánási kerékpár út,
- EU park, EU park háromszög, Skate pálya,
- Temetők, /Zsidó-, Keleti-, Kukuca-, Köz-, Vágóhidi-/
- Közigazgatási területen található összes utca, illetve krt.,
- Fehértói, illetve Böszörményi úti fészületek.

A fűkaszálás által levágott zöldterület mennyisége összesen 914.450 m<sup>2</sup>, melyhez 2760,62 liter üzemanyagot használtunk fel.

| Hónapok             | Lekaszált m <sup>2</sup> | Ebből:<br>parlagfű m <sup>2</sup> |
|---------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Április             | 50.100                   |                                   |
| Május               | 119.850                  | 2.950                             |
| Június              | 120.400                  | 48.250                            |
| Július              | 135.300                  | 48.250                            |
| Augusztus           | 166.850                  |                                   |
| Szeptember          | 179.450                  |                                   |
| Október             | 142.500                  |                                   |
| <b>Mindösszesen</b> | <b>914.450</b>           | <b>99.450</b>                     |

December hónapban vette ki a dolgozók többsége a szabadságokat, így a megmaradt kevés létszámmal folytatódott az ároktisztítás, padka-karbantartás az időjárási viszonyoktól függően.

A Start munka-programban használt traktor segítségével az árkok takarítása alkalmával keletkezett gaz, szemét egyéb hordalékanyag szállítása, a vízgyűjtő akna takarítása során keletkezett szemét, illetve iszapréteg az átereszek kialakításánál a betongyűrűk ki, illetve sérült betongyűrűk beszállítása megtörtént. Hajdúdorog közigazgatási területén motoros fűkaszával vágott zöld övezetknél keletkezett fűvet (gazit) a komposztáló telepre szállítottuk. Az árkok, illetve átereszek takarításánál összegyűlt falevelek is a komposztálóba került beszállításra.

Az árkok mederlapozásánál, illetve a támfalak készítéséhez szükséges (beton, sóder, drótháló, mederlapok, betonacélok) kiszállítása folyamatosan megtörtént a traktorral, illetve a KIA típusú kis tehergépkocsival.

A szükséges anyagok beszerzésre kerültek. A Téli-és egyéb értékteremtő – térkő-gyártó - programelem a projekt részére legyártotta a szükséges mederlapokat. Az év folyamán mindösszesen 4420 db-ot gyártottak. Tervezéskor 3750m<sup>2</sup> mederlap gyártását terveztük. Azonban az év folyamán a Belvízelvezetés programelemnek sikerült nagyon gondosan kiszedni az eredeti mederlapokat, melyeket visszaépítettek takarítás után és így kevesebb mennyiség is elegendő volt. Ehhez az anyag mennyiség beszerzésre került. A fel nem használt 248 m<sup>3</sup> sóder és 992q cement raktári készleten van, mivel a jövőben is gyártani fognak még meder lapokat.

### Tervezett beruházási és dologi költségek

| Megnevezés<br>Költség nemenként | Nettó érték<br>Ft-ban | Áfa 27%<br>Ft-ban | Összesen<br>Ft-ban |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
| Munka- és védőeszközök          | 463.290               | 125.088           | 588.378            |
| Alkalmassági vizsgálat díja     | 70.300                |                   | 70.300             |
| Kis értékű tárgyi eszközök      |                       |                   |                    |
| Nagy értékű tárgyi eszközök     |                       |                   |                    |
| Beruházási- és dologi költségek | 7.070.900             | 1.909.143         | 8.980.043          |
| Egyéb költségek (minősítés)     |                       |                   |                    |
| <b>Mindösszesen:</b>            | <b>7.604.490</b>      | <b>2.034.231</b>  | <b>9.638.721</b>   |

### Tényleges beruházási és dologi költségek

| Megnevezés<br>Költség nemenként    | Nettó érték<br>Ft-ban | Áfa 27%<br>Ft-ban | Összesen<br>Ft-ban |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
| Munka- és védőeszközök             | 463.290               | 125.088           | 588.378            |
| <i>Alkalmassági vizsgálat díja</i> |                       |                   |                    |
| Kis értékű tárgyi eszközök         | 145.019               | 39.158            | 184.177            |
| Nagy értékű tárgyi eszközök        |                       |                   |                    |
| Beruházási- és dologi költségek    | 6.981.231             | 1.884.935         | 8.866.166          |
| <i>Egyéb költségek (minősítés)</i> |                       |                   |                    |
| <b>Mindösszesen:</b>               | <b>7.589.540</b>      | <b>2.049.181</b>  | <b>9.638.721</b>   |

Hatósági szerződés-módosítást két alkalommal kértünk:

a.) sóder, térháló, periodikus vas, lágy vashuzal beszerzési egységára alacsonyabb volt a tervezettnél, illetőleg az alkalmassági vizsgálat díja nem került felhasználásra. Az így keletkezett **731.665.-Ft-os** megtakarításból eszközöket vásároltunk, melyek beszerzését szükségesnek ítéltük meg, illetve a hatékony munkavégzéshez fontosak és tervezéskor nem számoltunk vele.

Az alábbi kis értékű tárgyi eszközöket vásároltuk **184.177.-Ft** értékben

|                                  |    |    |          |                |               |                |
|----------------------------------|----|----|----------|----------------|---------------|----------------|
| vízszivattyú                     | db | 3  | 17 236,2 | 51 709         | 13 961        | 65 670         |
| kis fejsze                       | db | 10 | 1 497    | 14 960         | 4 042         | 19 002         |
| nagy fejsze                      | db | 3  | 3 150    | 9 450          | 2 552         | 12 002         |
| ágvágó                           | db | 4  | 2 205    | 8 820          | 2 382         | 11 202         |
| hosszabbító 100 m-es             | db | 1  | 18 268   | 18 268         | 4 932         | 23 200         |
| hosszabbító 50 m-es              | db | 2  | 11 654   | 23 308         | 6 293         | 29 601         |
| hosszabbító 25 m-es              | db | 2  | 7 441    | 14 882         | 4 018         | 18 900         |
| gumikalapács kicsi               | db | 2  | 866      | 1 732          | 468           | 2 200          |
| gumikalapács nagy                | db | 2  | 945      | 1 890          | 510           | 2 400          |
| <b>Kis értékű tárgyi eszköz:</b> |    |    |          | <b>145 019</b> | <b>39 158</b> | <b>184 177</b> |

**548.488.-Ft**-ot csoportosítottunk át beruházási költségek között. Az összegből olyan anyagokat vásároltuk meg, melyeket korábban nem terveztünk be:

|                                |     |     |         |                |               |               |
|--------------------------------|-----|-----|---------|----------------|---------------|---------------|
| GV-35 szigetelőpapír 10m       | db  | 4   | 5 450   | 21 800         | 5 886         | 27 686        |
| hegesztőpálca 5 kg-os          | dob | 10  | 3 500   | 35 000         | 9 450         | 44 450        |
| vágókorong 125-ös              | db  | 20  | 275     | 5 500          | 1 485         | 6 985         |
| vágókorong 230-as              | db  | 20  | 590     | 11 800         | 3 186         | 14 986        |
| tisztítókorong 125-ös          | db  | 20  | 275     | 5 500          | 1 485         | 6 985         |
| szeg 65-ös,80-as,120-as        | kg  | 30  | 290     | 8 700          | 2 349         | 11 049        |
| damil fej                      | db  | 3   | 4745,6  | 14 238         | 3 843         | 18 081        |
| damil                          | db  | 1   | 16 554  | 16 554         | 4 469         | 21 024        |
| üzemanyag                      | l   | 156 | 355     | 55 354         | 14 946        | 70 300        |
| folyami homok                  | m3  | 70  | 3666.39 | 256 647        | 69 295        | 325 942       |
| <b>Beruházási költség növ:</b> |     |     |         | <b>344 947</b> | <b>93 136</b> | <b>547488</b> |

b.) Tervezéskor nem csak üzemanyagra, hanem kenőanyagra is szükség van a különböző gépeknél. Ezért fontos volt minimális összeg kenőanyagra történő átcsoportosítása az alábbiak szerint:

|                       |            |               |         |            |               |
|-----------------------|------------|---------------|---------|------------|---------------|
| Üzemanyag             | 2656 liter | 1.197.425.-Ft | helyett | 2289 liter | 1.032.028.-Ft |
| Olaj, kenő olaj, stb. |            |               |         | 44 liter   | 165.397.-Ft   |

A Belvízelvezetés program 9.638.721.-Ft-os közvetlen költségeiből 2013. július 31. napjáig 7.556.361.-Ft-tal elszámoltunk. Az alkalmassági vizsgálat díjával, munkaruha- és üzemanyag összegével azonban nem számolunk el.

#### Előleg visszafizetésének alakulása

| Utalás hónapja  | Elszámolt beruházási költség | Beruházási költség előleg | Elszámolt működési költség | Működési költség előleg | Bér és járulékai előleg |
|-----------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| augusztus       | 7.191.553.-Ft                | 6.158.727.-Ft             | 364.808.-Ft                | 364.808.-Ft             | 2.128.423.-Ft           |
| szeptember      |                              |                           |                            |                         | 2.128.423.-Ft           |
| október         |                              |                           |                            |                         | 2.128.424.-Ft           |
| december        | 1.421.700.-Ft                |                           | 407.744.-Ft                | 223.570.-Ft             |                         |
| január          | 246.653.-Ft                  |                           |                            |                         |                         |
| <b>Összesen</b> | <b>8.859.906.-Ft</b>         | <b>6.158.727.-Ft</b>      | <b>772.552.-Ft</b>         | <b>588.378.-Ft</b>      | <b>6.385.270.-Ft</b>    |

2013. december 15. napjáig az beruházási költségek elszámolása megtörtént. Probléma az üzemanyag elszámolásnál volt, mivel a munkavezetők kártyával vásároltak az egyes programokhoz. Ha a projekt kártyájáról elfogyott az összeg, a másik program kártyájáról tankoltak. Ennek kibogozása és a tényleges költségviselőnek történő átkönyvelése nem volt egyszerű feladat.

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Beruházási költség    | 8.859.906.-Ft    |
| Működési költség      | 772.552.-Ft      |
| Mindösszesen költség: | 9.632.458.-Ft    |
| Tervezett költség     | 9.638.721.-Ft    |
| <b>Különbség:</b>     | <b>6.263.-Ft</b> |



Maradványként 6.263.-Ft jelentkezett és ez az összeg meghiúsulási összegként nem került sem elszámolásra, sem kiutalásra. A végelszámolásnál a folyami homok, üzemanyag és kis fejsze számlán szereplő értéke volt kevesebb a tervezettnél.

Munkabérrel történő elszámolás minden hónap 15. napjáig megtörtént.

Tervezett bérkötség (bér és járulécai) összesen: 31.622.296.-Ft

Ténylegesen elszámolt bérek és járulécai: 29.748.444.-Ft

**Különbözet: 1.873.852.-Ft**

2014. február 15. napjáig pótlólagos munkabér igényt nyújtottunk be, mivel a MÁK a 2014. január havi munkabérrel számolt el 2013. december hónapra esedékes betegszabadságra járó juttatást.

2013. évben összesen foglalkoztatott 45 fő, melyből

- 5 fő 25 év alatti
- 35 fő 25-55 év közötti
- 5 fő 55 év feletti
  
- 9 főnek közös megegyezéssel szűnt meg a közfoglalkoztatási jogviszonya,
- 1 főnek rendkívüli felmondással a munkáltató részéről,
- 35 főnek határozott idejű munkaszerződése lejárt.
  
- 3 fő nő,
- 42 fő férfi.
  
- 14 fő 136 nap betegszabadságon,
- 8 fő 49 nap táppénzen,
- 1 fő 2 nap baleseti táppénzen
- 1 fő 2 nap gyermekápolási táppénzen,
- 5 fő összesen 21 napot hiányzott igazoltan és igazolatlanul.
  
- 210 nap esett ki a termelésből hiányzás miatt
- 20 munkanap pótlás miatti kiesés volt. Termelésből mindösszesen: 230 nap esett ki.

## ÖSSZEGZÉS

A nehézségek ellenére a programban vállalt feladatokat igyekeztünk teljesíteni. Ha a tervezett utcát, nem volt lehetőségünk, vagy egyéb ok miatt nem tudtuk rendbe tenni, igyekeztünk helyette legalább olyan hosszúságú és munkavégzést igénylő utcát, árkot megfelelően karbantartani. Igaz nem gyártattunk le annyi mederlapot, amennyit a tervezéskor vállaltunk, de az anyag a telephelyen felleltározásra került.

Elmondható, hogy az utak melletti árkok és azok közvetlen környéke rendezett, de ez mindig olyan feladat, amit újra és újra kell kezdeni.

A következő években is igyekszünk ilyen és hasonló feladat ellátásához támogatást szerezni, mert saját erőből sem a lakosság, sem az önkormányzat nem képes megoldani a belvíz teljes mértékű elvezetését.

Gond volt a bérek elszámolásával az év utolsó három hónapjában. Másként számolt a MÁK és másként a Munkaügyi Központ. Ez inkább kellemetlenségnek nevezhető, ami talán elkerülhető is lehetett volna.

Örömmel nyugtázható, hogy 10 hónapra biztos munkalehetőséget teremtettünk minimum 25 munkavállalónak. Azonban az elsődleges munkaerőpiac hiánya miatt a munkavállalók nagy részének sincs lehetősége a közfoglalkoztatáson kívül elhelyezkednie.

**Hajdúdorog, 2014. január 30.**



Csige Tamás  
polgármester




**1. sz. melléklet Megtisztított folyóméter mindösszesen: 33.310 fm**

| <b>Utcák neve</b>  | <b>Megtisztított fm</b> |
|--------------------|-------------------------|
| Ady Endre út       | 1160                    |
| Agyag utva         | 20                      |
| Akácfa utca        | 530                     |
| Árpád krt          | 2850                    |
| Bocskai körút      | 1025                    |
| Böszörményi utca   | 1525                    |
| Csonka utca        | 125                     |
| Darabos utca       | 525                     |
| Dohány utca        | 115                     |
| Dohánybeváltó utca | 1060                    |
| Dózsa György utca  | 100                     |
| Fehértói út        | 90                      |
| Fogadó utca        | 815                     |
| Fürdő utca         | 785                     |
| Füzes utca         | 530                     |
| Gáti utca          | 170                     |
| Görög Demeter utca | 235                     |
| Gyepszél utca      | 1130                    |
| Hajnal utca        | 20                      |
| Hétút út           | 1950                    |
| Hunyadi út         | 475                     |
| Iskola utca        | 255                     |
| Jaczkovics utca    | 560                     |
| Keleti utca        | 125                     |
| Kórház utca        | 75                      |
| Kossuth utca       | 220                     |
| Kurucz utca        | 435                     |
| Kút utca           | 330                     |
| Magyar utca        | 1010                    |
| Marx Károly utca   | 100                     |
| Mátyás krt         | 2575                    |
| Méntelep utca      | 385                     |
| Mester utca        | 865                     |
| Nagy Sándor út     | 605                     |
| Nánási út          | 475                     |
| Nyíl utca          | 1940                    |
| Nyiregyházi utca   | 805                     |
| Pacsirta utca      | 20                      |
| Petőfi Sándor utca | 1575                    |
| Rákóczi krt.       | 850                     |
| Régi Tokaji út     | 875                     |
| Tégla utca         | 85                      |
| Toborzó utca       | 775                     |
| Tokaji út          | 780                     |
| Újtelep utca       | 110                     |
| Városkert utca     | 780                     |
| Vasút utca         | 100                     |
| Vasvári út         | 140                     |
| Vércse utca        | 15                      |
| Vidító utca        | 110                     |
| Virág utca         | 860                     |
| Vörösmarty utca    | 190                     |
| Zöld utca          | 50                      |
| <b>Összesen</b>    | <b>33310</b>            |

Belvízelvezetés az Agzag utcán a zsiliptól a Kukuca temető vízelvezető csatornájáig.



Belvízelvezetés a Tégla úton:

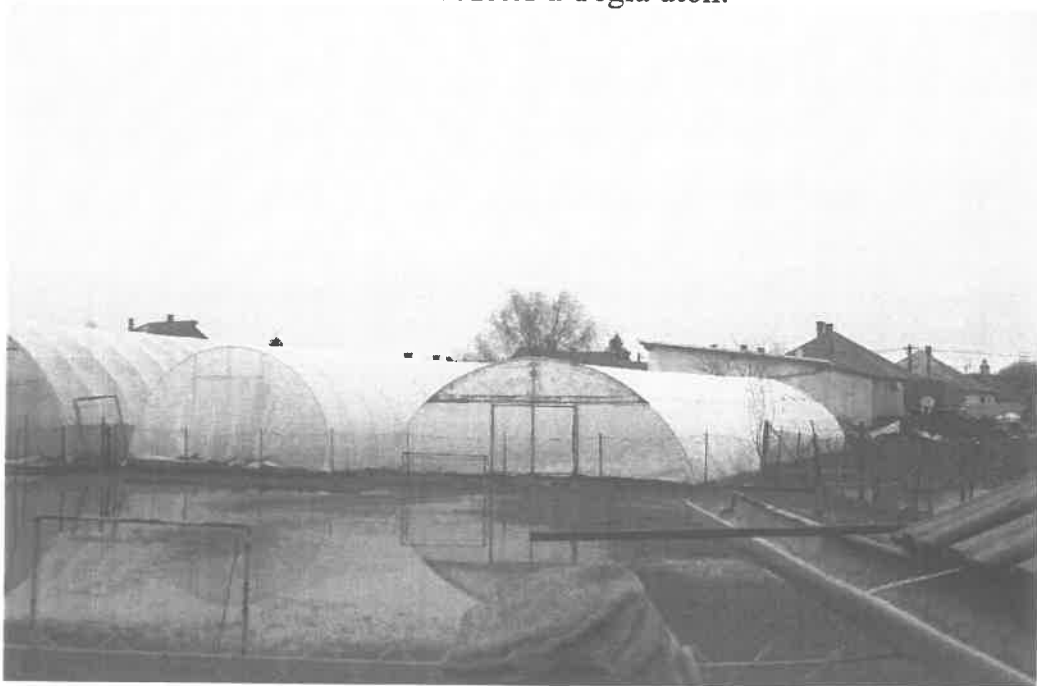

Ároktisztítás a Böszörményi u. végén:



Motoros fűkaszás a Strandfürdő előtti részen:











