Vizsgálatot végezte:	Műszeres favizsgálati lap	Megrendelő:
Kovács Gergely	Vizsgálat időpontja:	Parkfenntartó Kft.
Minősített favizsgáló: FV-19/007	2026. szeptember	

Fa adatai	
Fa QTA száma:	1
Azonosítója:	8051
Latin név:	Celtis occidentalis

Műszeres mérés adatai	
Érzékelők pozíció sémája:	Irregulár
Mérési magasság:	45
Érzékelők száma:	10
Mérési réteg kerülete:	


Fakopp 3D akusztikus tomográf vizsgálat mérési eredménye:


Korhadt terület aránya: **82%**


Biztonsági faktor értéke 23,6 m/s szélsebesség esetén városi környezetben:	**124%**

MÉRSÉKELT KOCKÁZAT

50% alatt	Extrém kockázat
51-100% között	Magas kockázat
101-150% között	Mérsékelt kockázat
151 % felett	Alacsony kockázat

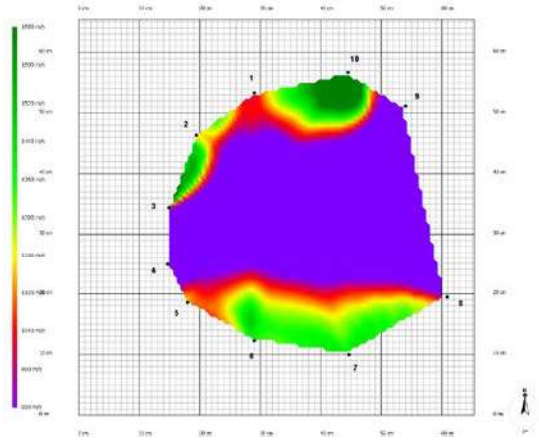

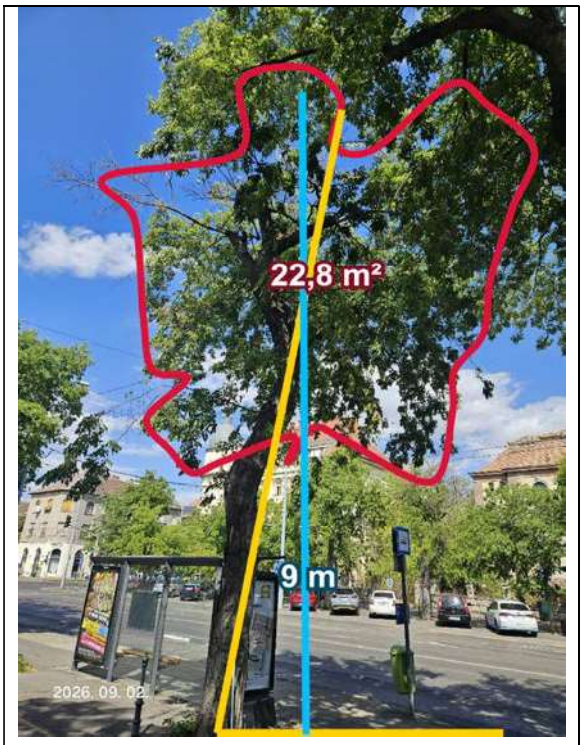

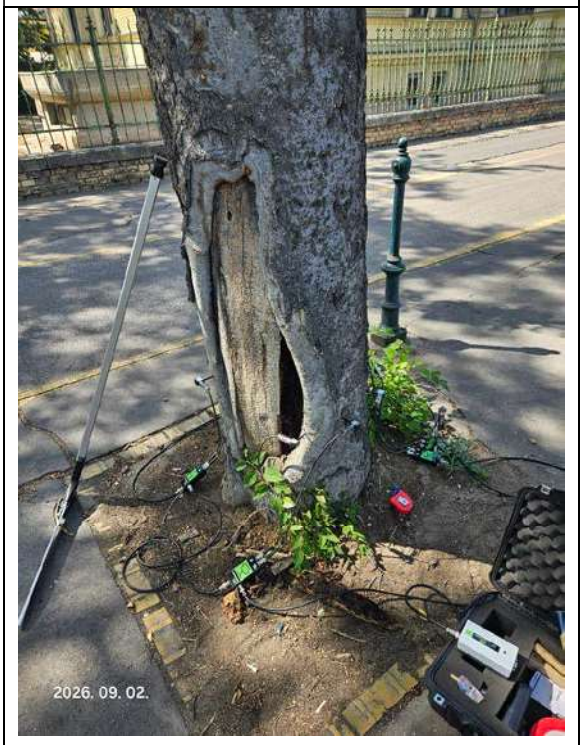

Vizuális és műszeres favizsgálat összefoglalása

Statikai kiértékelés alapján a vizsgált keresztmetszetben, a jelenlegi nagyon csökkentett koronamérettel, a fa törésbiztonsága mérsékelt kockázatú. A törzs nagyon jelentős mértékű 82%-os korhadása miatt a fa egészségi állapota nem javítható. A törzs és a gyökérnyak előrehaladott odvasodása miatt a fa veszélyes.

A több éves szakmai tapasztalat és megszerzett ismeretek felhasználásával készített favizsgálati jegyzőkönyvben foglaltak tudomásul vétele és az előírt ápolási munkák elvégzése sem garantálja a fa százszázalékos biztonságosságát rendkívüli időjárás vagy egyéb, előre nem látható körülmények között. A vizsgáló az esetleges károkozásért nem vonható felelősségre!

Vizsgálatot végezte:	Műszeres favizsgálati lap	Megrendelő:
Kovács Gergely	Vizsgálat időpontja:	Parkfenntartó Kft.
Minősített favizsgáló: FV-19/007	2026. szeptember	

Fa adatai	
Fa QTA száma:	2
Azonosítója:	8056
Latin név:	Celtis occidentalis

Műszeres mérés adatai	
Érzékelők pozíció sémája:	Ellipszis
Mérési magasság:	210
Érzékelők száma:	10
Mérési réteg kerülete:	143


Fakopp 3D akusztikus tomográf vizsgálat mérési eredménye:


Korhadt terület aránya: **65%**

Biztonsági faktor értéke 23,6 m/s szélsebesség esetén városi környezetben:	**181%**

ALACSONY KOCKÁZAT

50% alatt	Extrém kockázat
51-100% között	Magas kockázat
101-150% között	Mérsékelt kockázat
151 % felett	Alacsony kockázat

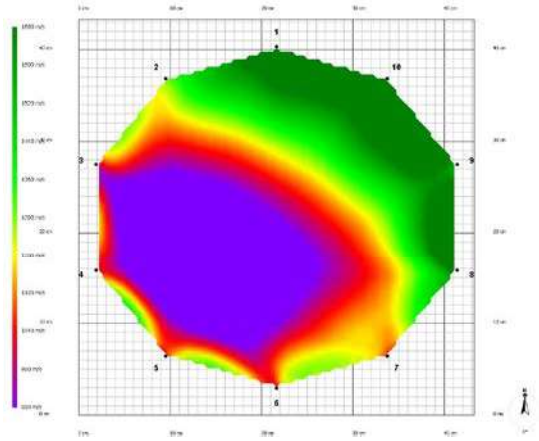

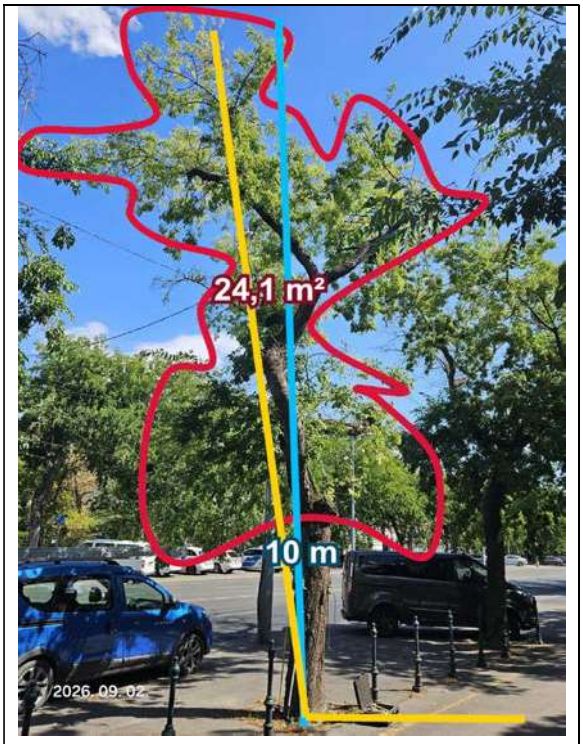



Vizuális és műszeres favizsgálat összefoglalása

Statikai kiértékelés alapján a vizsgált keresztmetszet törésbiztonsága alacsony kockázatú, úgyanakkor a törzsön és mindkét vázágon nagymértékű taplófertőzés miatt vázágleszakadás veszélye áll fenn, illetve a fa vigorozitása sem megfelelő.

A több éves szakmai tapasztalat és megszerzett ismeretek felhasználásával készített favizsgálati jegyzőkönyvben foglaltak tudomásul vétele és az előírt ápolási munkák elvégzése sem garantálja a fa százszázalékos biztonságosságát rendkívüli időjárás vagy egyéb, előre nem látható körülmények között. A vizsgáló az esetleges károkozásért nem vonható felelősségre!

Vizsgálatot végezte:	Műszeres favizsgálati lap	Megrendelő:
Kovács Gergely	Vizsgálat időpontja:	Parkfenntartó Kft.
Minősített favizsgáló: FV-19/007	2026. szeptember	

Fa adatai	
Fa QTA száma:	3
Azonosítója:	8074
Latin név:	Celtis occidentalis

Műszeres mérés adatai	
Érzékelők pozíció sémája:	Ellipszis
Mérési magasság:	150
Érzékelők száma:	10
Mérési réteg kerülete:	163


Fakopp 3D akusztikus tomográf vizsgálat mérési eredménye:


Korhadt terület aránya: **60%**

Biztonsági faktor értéke 23,6 m/s szélsebesség esetén városi környezetben:	**82%**

MAGAS KOCKÁZAT

50% alatt	Extrém kockázat
51-100% között	Magas kockázat
101-150% között	Mérsékelt kockázat
151 % felett	Alacsony kockázat

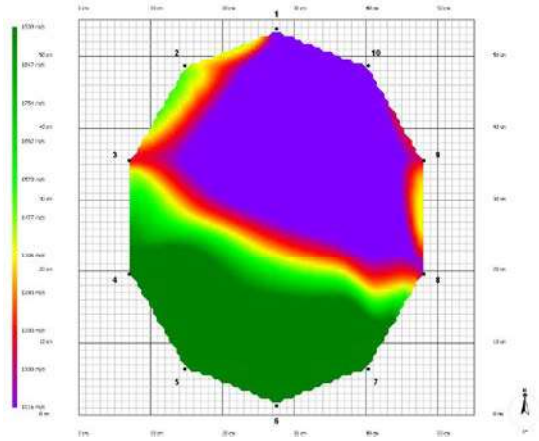

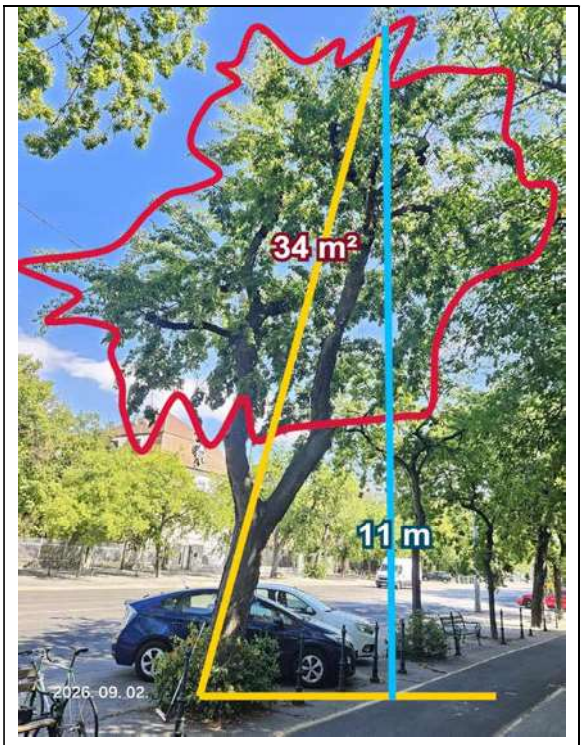



Vizuális és műszeres favizsgálat összefoglalása

A statikai kiértékelés alapján a fa magas töréskockázatú a vizsgált keresztmetszetben. Mivel a gyökérnyak és a koronaalap is hasonlóan rossz állapotban van a fa nem megtartható. Kitörés, vázágleszakadás veszélye.

A több éves szakmai tapasztalat és megszerzett ismeretek felhasználásával készített favizsgálati jegyzőkönyvben foglaltak tudomásul vétele és az előírt ápolási munkák elvégzése sem garantálja a fa százszázalékos biztonságosságát rendkívüli időjárás vagy egyéb, előre nem látható körülmények között. A vizsgáló az esetleges károkozásért nem vonható felelősségre!

Vizsgálatot végezte:	Műszeres favizsgálati lap	Megrendelő:
Kovács Gergely	Vizsgálat időpontja:	Parkfenntartó Kft.
Minősített favizsgáló: FV-19/007	2026. szeptember	

Fa adatai	
Fa QTA száma:	4
Azonosítója:	8080
Latin név:	000130KD
	Celtis occidentalis

Műszeres mérés adatai	
Érzékelők pozíció sémája:	Irregulár
Mérési magasság:	200
Érzékelők száma:	10
Mérési réteg kerülete:	


Fakopp 3D akusztikus tomográf vizsgálat mérési eredménye:


Korhadt terület aránya: **45%**

Biztonsági faktor értéke 23,6 m/s szélsebesség esetén városi környezetben:	**65%**

MAGAS KOCKÁZAT

50% alatt	Extrém kockázat
51-100% között	Magas kockázat
101-150% között	Mérsékelt kockázat
151 % felett	Alacsony kockázat

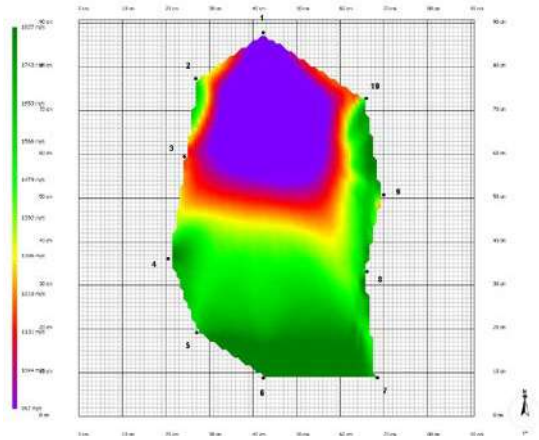

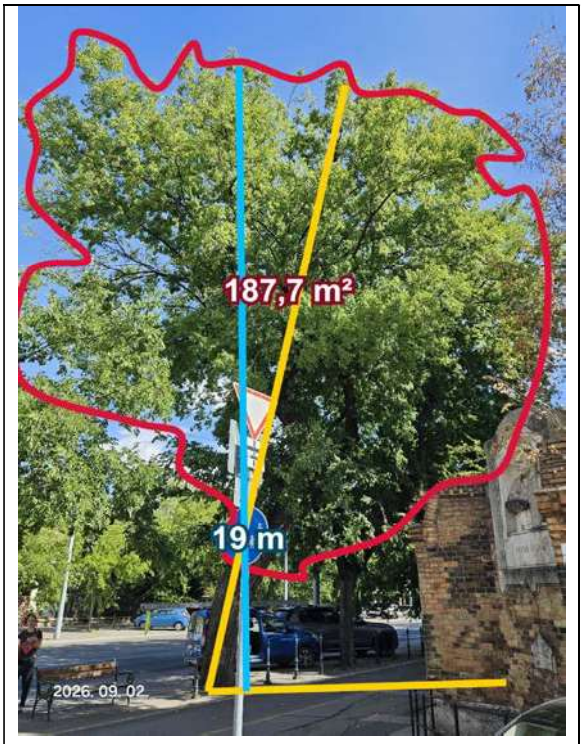



Vizuális és műszeres favizsgálat összefoglalása

A műszeres mérést egy korábbi betonnal plombált, bekorhadt ághely magasságában végetük, ahol a fatest törése is látszik. A statikai kiértékelés alapján a fa magas kockázatú. Mivel a koronában és a koronaalapnál egyéb nagy mértékű károsodás nem látható, így az előírt jelentős koronakurtítással, rendszeres felülvizsgálat mellett még megtartható.

A több éves szakmai tapasztalat és megszerzett ismeretek felhasználásával készített favizsgálati jegyzőkönyvben foglaltak tudomásul vétele és az előírt ápolási munkák elvégzése sem garantálja a fa százszázalékos biztonságosságát rendkívüli időjárás vagy egyéb, előre nem látható körülmények között. A vizsgáló az esetleges károkozásért nem vonható felelősségre!

Vizsgálatot végezte:	Műszeres favizsgálati lap	Megrendelő:
Kovács Gergely	Vizsgálat időpontja:	Parkfenntartó Kft.
Minősített favizsgáló: FV-19/007	2026. szeptember	

Fa adatai	
Fa QTA száma:	5
Azonosítója:	8095
Latin név:	Celtis occidentalis

Műszeres mérés adatai	
Érzékelők pozíció sémája:	Ellipszis
Mérési magasság:	90
Érzékelők száma:	10
Mérési réteg kerülete:	170


Fakopp 3D akusztikus tomográf vizsgálat mérési eredménye:


Korhadt terület aránya: **62%**

Biztonsági faktor értéke 23,6 m/s szélsebesség esetén városi környezetben:	**83%**

MAGAS KOCKÁZAT

50% alatt	Extrém kockázat
51-100% között	Magas kockázat
101-150% között	Mérsékelt kockázat
151 % felett	Alacsony kockázat

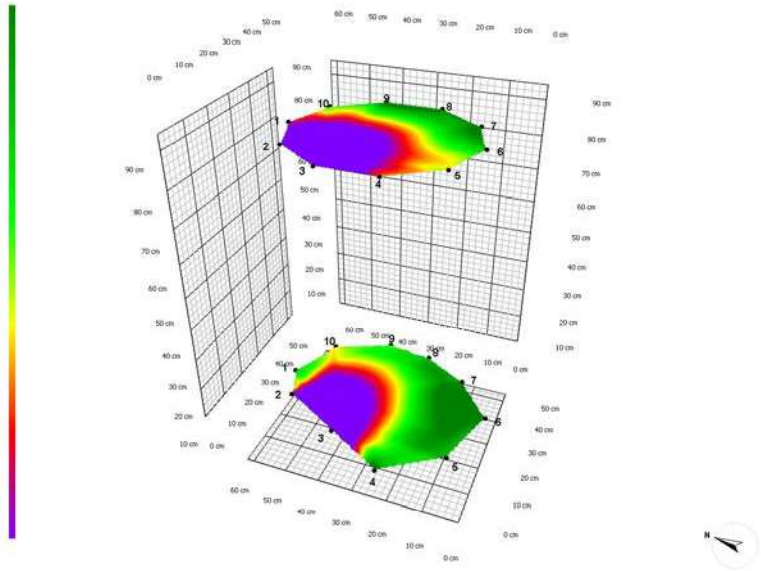

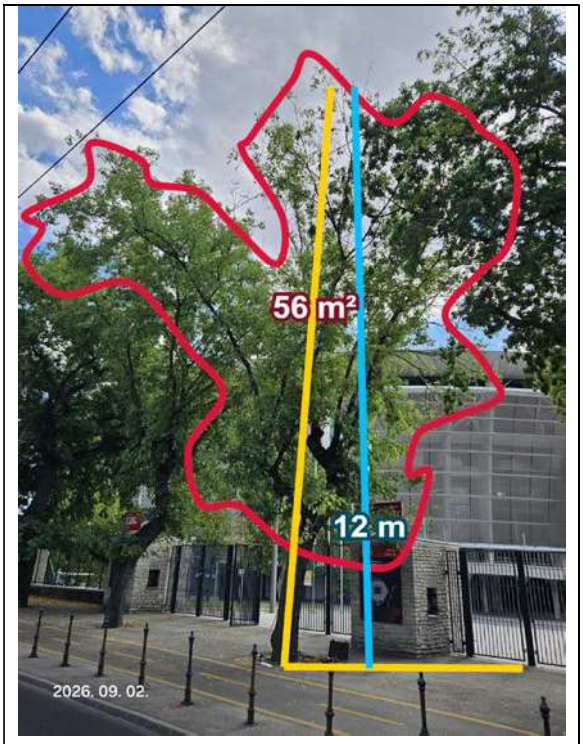



Vizuális és műszeres favizsgálat összefoglalása

A statikai kiértékelés alapján a fa magas töréskockázatú a vizsgált keresztmetszetben. Mivel a gyökérnyak és a koronaalap is hasonlóan rossz állapotban van a fa nem megtartható. Kitörés, vázágleszakadás veszélye.

A több éves szakmai tapasztalat és megszerzett ismeretek felhasználásával készített favizsgálati jegyzőkönyvben foglaltak tudomásul vétele és az előírt ápolási munkák elvégzése sem garantálja a fa százszázalékos biztonságosságát rendkívüli időjárás vagy egyéb, előre nem látható körülmények között. A vizsgáló az esetleges károkozásért nem vonható felelősségre!
