

## Vállalkozási Szerződés 1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről

Megrendelő: **Dunavarsány Város Önkormányzata**  
címe: 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 18.  
adószám: 15730875-2-13  
bankszámlaszám: 11742180-15393197  
képviseli: Gergőné Varga Tünde polgármester  
telefon: +36-24/521-040  
telefax: +36-24/521-056  
e-mail cím: titkarsag@dunavarsany.hu

másrészről

Vállalkozó: **„GTE 2020” Konzorcium**

Vezető neve: **GÉP-LIGET ÉPÍTŐIPARI Kft.**  
címe: 2330 Dunaharaszti, Somogyvári Gyula utca 27.  
adószám: 13811233-2-13  
cégjegyzékszám: 13-09-109815  
bankszámlaszám: 10300002-10298371-49020017  
képviseli: Szecsődi György ügyvezető  
telefon/telefax: +36302101123  
e-mail cím: gepliget987@gmail.com

Tag neve: **EFFICIENT Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft.**  
címe: 2132 Göd, Regős u. 20.  
adószám: 12817535-2-13  
cégjegyzékszám: 13-09-090744  
bankszámlaszám: 11600006-00000000-05800946  
képviseli: Ácsné Danyi Ilona ügyvezető  
telefon/telefax: +36 204225926  
e-mail cím: ilona.danyi@efficient-co.eu

Tag neve: **Dunavarsányi Tiszta Víz Kft.**  
címe: 2336 Dunavarsány, Déri Miksa utca 4.  
adószám: 10885664-2-13  
cégjegyzékszám: 13-09-067648  
bankszámlaszám: 11742180-20061416-00000000  
képviseli: Ácsné Danyi Ilona ügyvezető, akadályoztatása esetén Bódis Miklós meghatalmazott képviselő  
telefon/telefax: +36 204801717  
e-mail cím: bodismiklos@dtvkt.hu

között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

1./


A Felek között 2020. április 6-án Vállalkozási Szerződés jött létre **Kerékpárút fejlesztés Dunavarsány Városában 2. tárgyában.**

2./ A Felek a Vállalkozási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

2.1./ A Vállalkozási Szerződés 1.6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1.6. Szerződéses vállalási díj a munka elvégzésére a vállalt teljesítési határidőre prognosztizálva egyösszegű átalánydíjban nettó **267.065.650 Ft + 27 % (72.107.726 Ft) ÁFA**, azaz nettó

*h. g. g.*



**kétszázhatvanhétmillió-hatvanötezer-hatszázötven forint + hetvenkétf millió-százhétezer-hétszázhuszonhat forint** ÁFA egyösszegű átalánydíj.

1.6.1. Szerződéses vállalási díjból az eredetileg megrendelt munkák ellenértéke egyösszegű átalánydíjban nettó **255.329.042 Ft + 27 % (68.938.841 Ft)** ÁFA.

1.6.2. Szerződéses vállalási díjból a pótmunkaként megrendelt munkák ellenértéke egyösszegű átalánydíjban nettó **11.736.248 Ft + 27 % (3.168.787 Ft)** ÁFA.”

2.2./ A Vállalkozási Szerződés 2.5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2.5. A Vállalkozó az 1.6.1. pont szerinti díj tekintetében jogosult részszámla kibocsátására az elvégzett teljesítéssel arányos mértékben a 25 százalékos, az 55 százalékos és a 75 százalékos készütségi fokról. A végszámla a sikeres műszaki átadás-átvételt követően nyújtható be. A Vállalkozó az 1.6.2. pont szerinti díj tekintetében nem jogosult részszámla kibocsátására. A pótmunkák végszámlája a teljesítést és annak műszaki ellenőr általi igazolását követően, az eredeti számlázási ütemezéstől elkülönülten nyújtható be.”

2.3./ A Vállalkozási Szerződés új melléklettel egészül ki:

„- 2. Pótmunka költségvetés.”

2.4./ A Vállalkozási Szerződés módosítással nem érintett rendelkezései változatlanok maradnak.

3./ A Vállalkozási Szerződés módosításának indoka:

A Megrendelő pótmunkaként rendeli meg a Vállalkozótól a Vörösmarty utcában a Búza utca és a Liget utca közötti szakaszon található lakóingatlanok gépkocsi behajtóiba teherbíró rácsos folyóka beépítését, a szükséges kiegészítő munkákkal együtt. A megrendelt munkák az eredeti szerződésben nem szerepeltek.

A szerződés módosítására a Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pontjában foglaltakra tekintettel kerül sor.

4./ A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg hozzájárulását adja, hogy a Megrendelő által elkészített és a Vállalkozó által megismert „Tájékoztató a szerződés módosításáról” megnevezésű hirdetményt a Megrendelő a Közbeszerzési Értesítőben megjelentesse.

Szerződő felek jelen 1. sz. szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Dunavarsány, 2020. augusztus 26.

2020. augusztus 31.....

**GÉP-LIGET KFT.**  
2351 Alsónémedi, Haraszti út 120/B  
Adószám: 13811233-2-13  
Banksz.: 10300002-10298371-49020017

*Gergőné Varga Tünde*  
**Gergőné Varga Tünde**  
polgármester

*Szecsődi György*  
**Szecsődi György**  
ügyvezető

*Ácsné Danyi Ilona*  
**Ácsné Danyi Ilona**  
ügyvezető

*Ácsné Danyi Ilona*  
**Ácsné Danyi Ilona**  
ügyvezető

Dunavarsány Város Önkormányzata

Gép-Liget Kft

**EFFICIENT Kft.**


Dunavarsányi  
Tiszta Víz Kft.

Megrendelő képviseletében

Vállalkozó képviseletében

2102 Gőz, Regős u. 20.  
Cisz.: 13-09-090744  
Adószám: 12817535-2-13

**DUNAVARSÁNYI  
TISZTA VÍZ KFT.**  
2336 Dunavarsány,  
Déri Miksa u. 4.  
Adószám: 10885664-2-13



Ellenjegyzem:

*Dr. Szilágyi Ákos*

**Dr. Szilágyi Ákos**

Dunavarsány Város Önkormányzatának jegyzője

Pénzügyi ellenjegyző:	
<i>[Signature]</i>	20200826
dátum	dátum

**Dunavarsány Város Önkormányzata**

2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 18.

Tel.: +36-24/521-040

Fax: +36-24/521-056

**Tárgy:** Kerékpár út fejlesztése Dunavarsányban - Felszíni vizek elvezetése a Vörösmarty utcában a Búza u. és Liget u. közötti szakaszon.

Tisztelt Rákos József Úr!

Önkormányzati Testület 2020 július 13-án tartott bizottsági ülésén döntés született arról, hogy felkéri a Vállalkozót (GTE-2020 Konzorcium) a Vörösmarty utcában (Búza u. és Liget u. közötti szakaszon) a kerékpár út építés során a vállaláson és a terveken felül vizsgálja meg, hogy milyen műszaki javaslatot tud tenni a felszíni vizek elvezetésére az ott lévő ingatlanok csapadék vízzel történő elárasztásának csökkentésének érdekében.

Konzorciumunk a fenti kérésnek megfelelően felülvizsgálta a lehetőségeket és az alábbi műszaki tartalommal tudjuk csökkenteni a felszíni csapadék víz által okozott elárasztásokat, de az időszakosan előforduló nagyobb vízmennyiség esetén ezzel a műszaki megoldással sem tudjuk garantálni és teljesen megszüntetni az ezzel kapcsolatos problémákat.

**Műszaki javaslat:**

A Vörösmarty utcában a Búza u. és Liget u. közötti szakaszon található lakóingatlanok gépkocsi behajtójába teherbíró rácsos folyókát építünk be az úttesttől 1m-re a padka külső vonalába. A folyóka által összegyűjtött vizet a kerékpár út kivitelezése során létesítendő szikkasztó árokba vezetjük be, mely kivezetést kimosódás elleni védelemmel látunk el. (melléklet). A javasolt műszaki megoldást alkalmazzuk ott is ahol jelenleg nincs szilárd burkolatú gépkocsi behajtó.

**Költségvetés:**

Tételek	Mennyiség		Egységár (nettó)		Összesen (Nettó)	
			Anyagdíj	Munkadíj	Anyagdíj	Munkadíj
Teherbíró rácsos folyóka építése 150/120, bekötése szikkasztó árokba	190	fm	39 000 Ft	18 600 Ft	7 410 000 Ft	3 534 000 Ft
KG-PVC 100	128	fm	3 617 Ft		462 976 Ft	
110X45° Csatorna ívidom	64	db	1 299 Ft		83 136 Ft	
PVC KGU-110 Áttoló karmantyú	128	db	1 337 Ft		171 136 Ft	
Kimosódás elleni védelem (beton)	4	m3	3 750 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	60 000 Ft
					<b>8 142 248 Ft</b>	<b>3 594 000 Ft</b>
<b>Összesen nettó:</b>					<b>11 736 248 Ft</b>	

G.S.S.

LT

Kerékpárút fejlesztés Dunavarsány Városában

Kérem mihamarabbi döntését a fenti műszaki javaslat megvalósíthatóságáról, mert addig ezen a szakaszon kivitelezést nem tudjuk megkezdeni.

Dunavarsány, 2020.07.28.


Üdvözlettel:



Novák Tamás  
GTE-2020 Konzorcium

Melléklet: Műszaki javaslat vázrajz





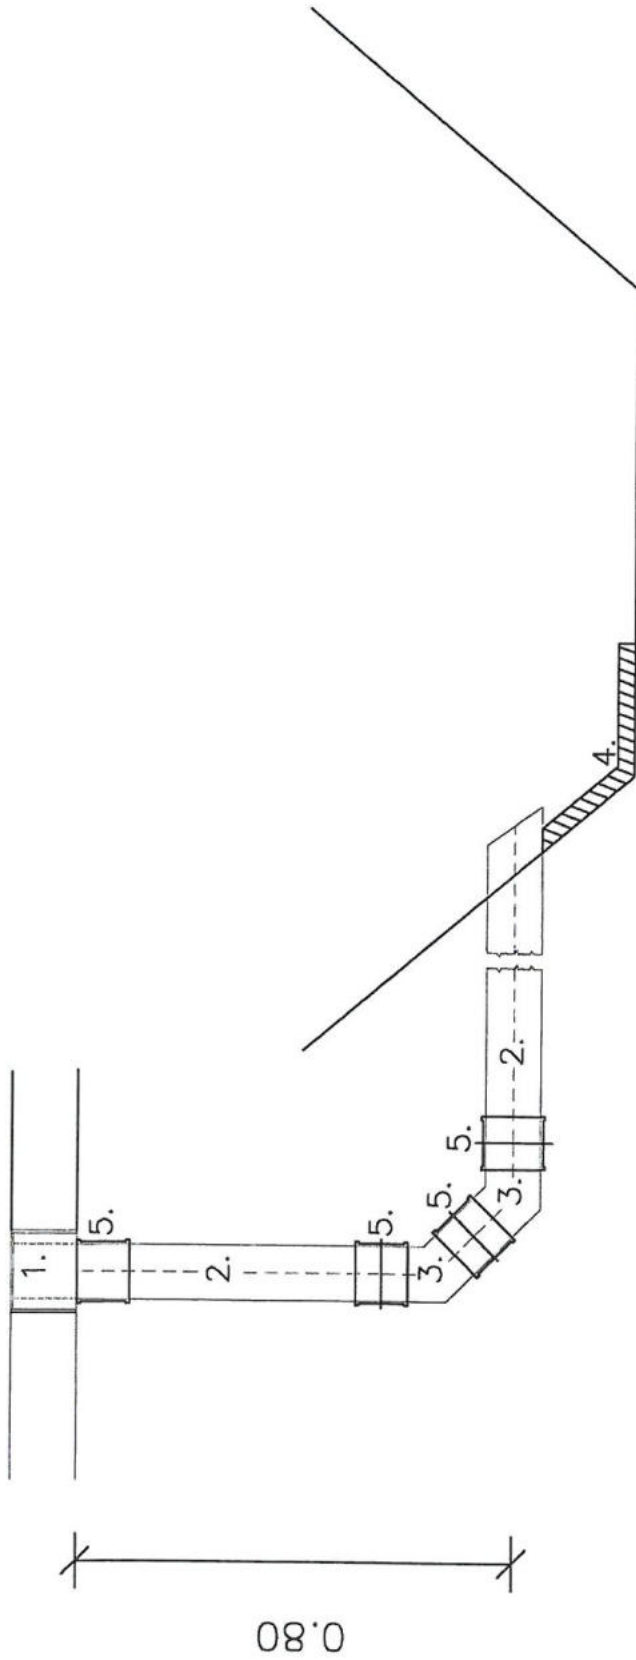

Kapubehajtónként szükséges tételek	
1.	Teherbíró rácsos folyóka 150/120
2.	KG-PVC 100 Cső
3.	110/45° Csatorna ívdom 2 db
4.	Kimosódás elleni védelem
5.	PVC KGU-110 Áttoló karmantyú

# 150/120 Rácsos folyóka kialakítás kapubehajtóknál

1.	150/120 Rácsos folyóka
2.	Kimosódás elleni védelem (beton)

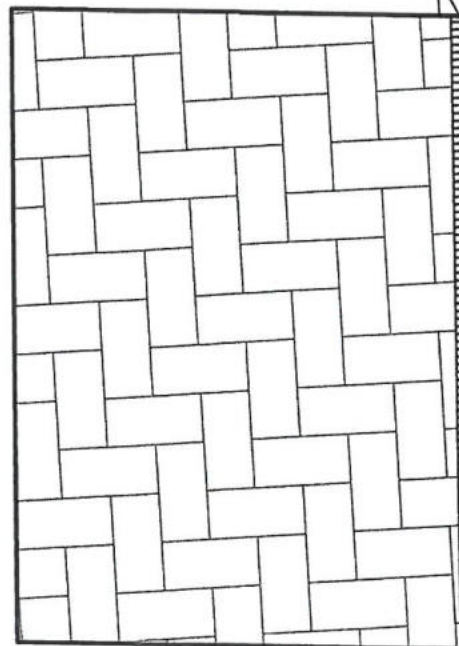

0.15 1.00

*h. G. sz.*
