

BEÉRKEZETT

2013-05-23 156546



E000803318  
ESZA Nonprofit Kft.

158011/2015

16788-028/012



SZÉCHENYI TERV


A projekt azonosító száma: TAMOP-5.4.11-12/1-2012-0001

A (fő)kedvezményezett neve: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társ

## 1. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ

### 1. Beszámoló azonosító adatai:

Beszámoló kitöltéséért felelős személy:	
Telefon:	
Fax:	
Email:	
A projekt tényleges kezdete és várható fizikai befejezése	
Tényleges kezdet dátuma:	2013.02.01
Várható fizikai befejezés dátuma:	2015.06.30

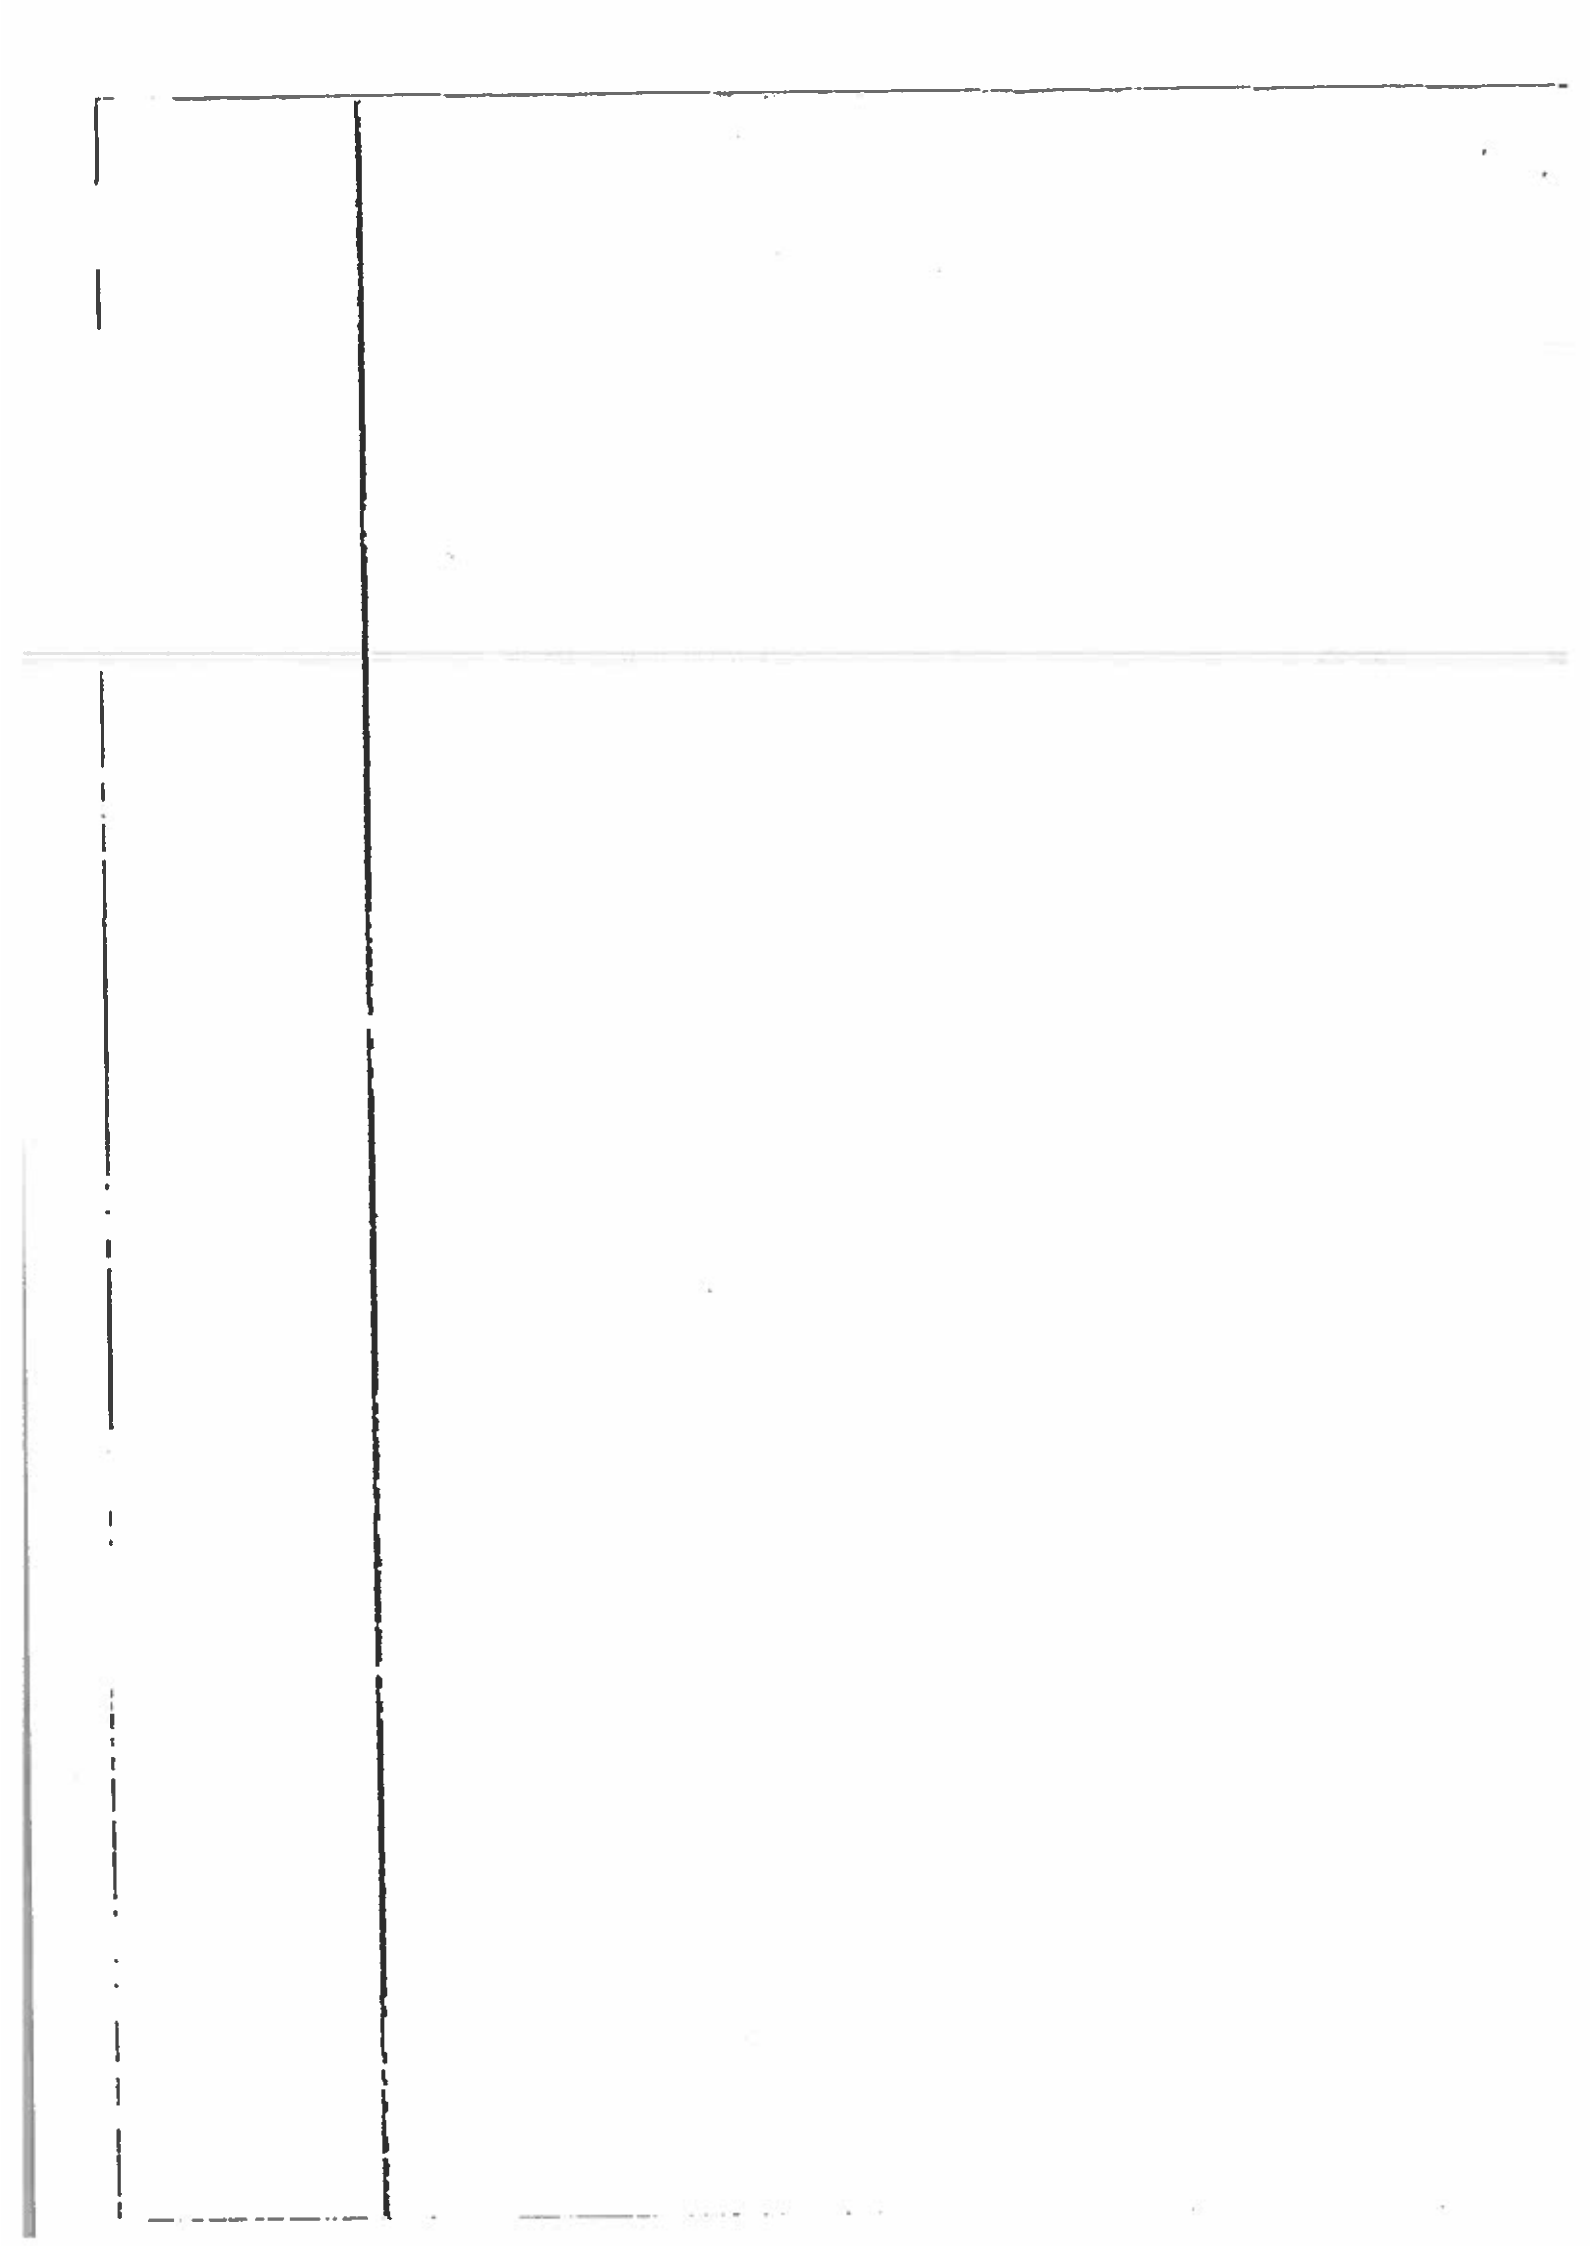


A projekt azonosító száma: TAMOP-5.4.11-12/1-2012-0001

A (fő)kezdvezményezett neve: Fogymenyelosegeert Kohasznu Nonprofit Korlatolt Felelősségű Társaság

## 2. Elvégzett tevékenységek

Tevékenység	Tervezett		Tényleges kezdete	Tényleges megvalósítás	Tevékenység előrehaladásának bemutatása	Eltérés oka és tervezett/megtett lépések
	kezdete	befejezése				
1 Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek	2013.02.01	2015.04.30	2013.02.01	2015.04.30	Kiválasztásra került a projekt megvalósításáért felelős szakmai stáb. A témavezetők (4 fő): asszisztensek (3 fő): Az Elszámolás az alábbi költségeket tartalmazza: III / 54 és 56. sor: a szakmai megvalósítók bér- és járulék költségei.	Nincsen eltérés.
2 Tartalék	2013.02.01	2015.04.30	2013.02.01	2015.04.30	A Tartalék felhasználására nem került sor, ezért nem releváns.	Nincsen eltérés.
3 Egyéb a projekt megvalósításával összefüggő (általános) költség	2013.02.01	2015.04.30	2013.02.01	2015.04.30	Az Elszámolás az alábbi költségeket tartalmazza: VIII/513. sor: a legszükségesebb Irodaszerek beszerzésének költségeit; VIII/527. sor: Posta, telefon, fax, internet költségeket; VIII/529. sor: A mellékelt Rezszi- és bérleti díj Arányosítási Módszerben foglalt szerinti rezszi- és bérleti költségeket; VIII/531. Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak: a Magyar Államkincstár elkülönített számlavezetési költségét.	Nincsen eltérés.
4 Beruházás (ERFA)	2013.02.01	2015.04.30	2013.02.01	2015.04.30	A projekt megkezdéséhez szükséges legfontosabb eszközök és bútorok beszerzése megtörtént. Az IKT eszközök között: 10 db Notebook (15.6"), 10 db Tablet (10.1"), 3 db Tablet (6.0"), 6 db Mobil telefon; a bútorok közül: 4 db íróasztal, 2 db tárgyaló asztal, 10 db tárgyaló szék, 8 db fiókos elem, 5 db irattároló szekrény beszerzésére került sor.	Nem került egyszerre beszerzésre a projekt megvalósításához betervezett teljes eszköz/bútor állomány. Ennek oka az, hogy a "Nyolc pont Projektiroda" (a projektgazda) nKft-vel együtt a jelenlegi helyéről 2013. május végén új helyszínre költözik. A még be nem szerzett eszközöket / bútorokat a új helyszínen adottságainak a figyelembevételével kívánjuk majd megvásárolni.

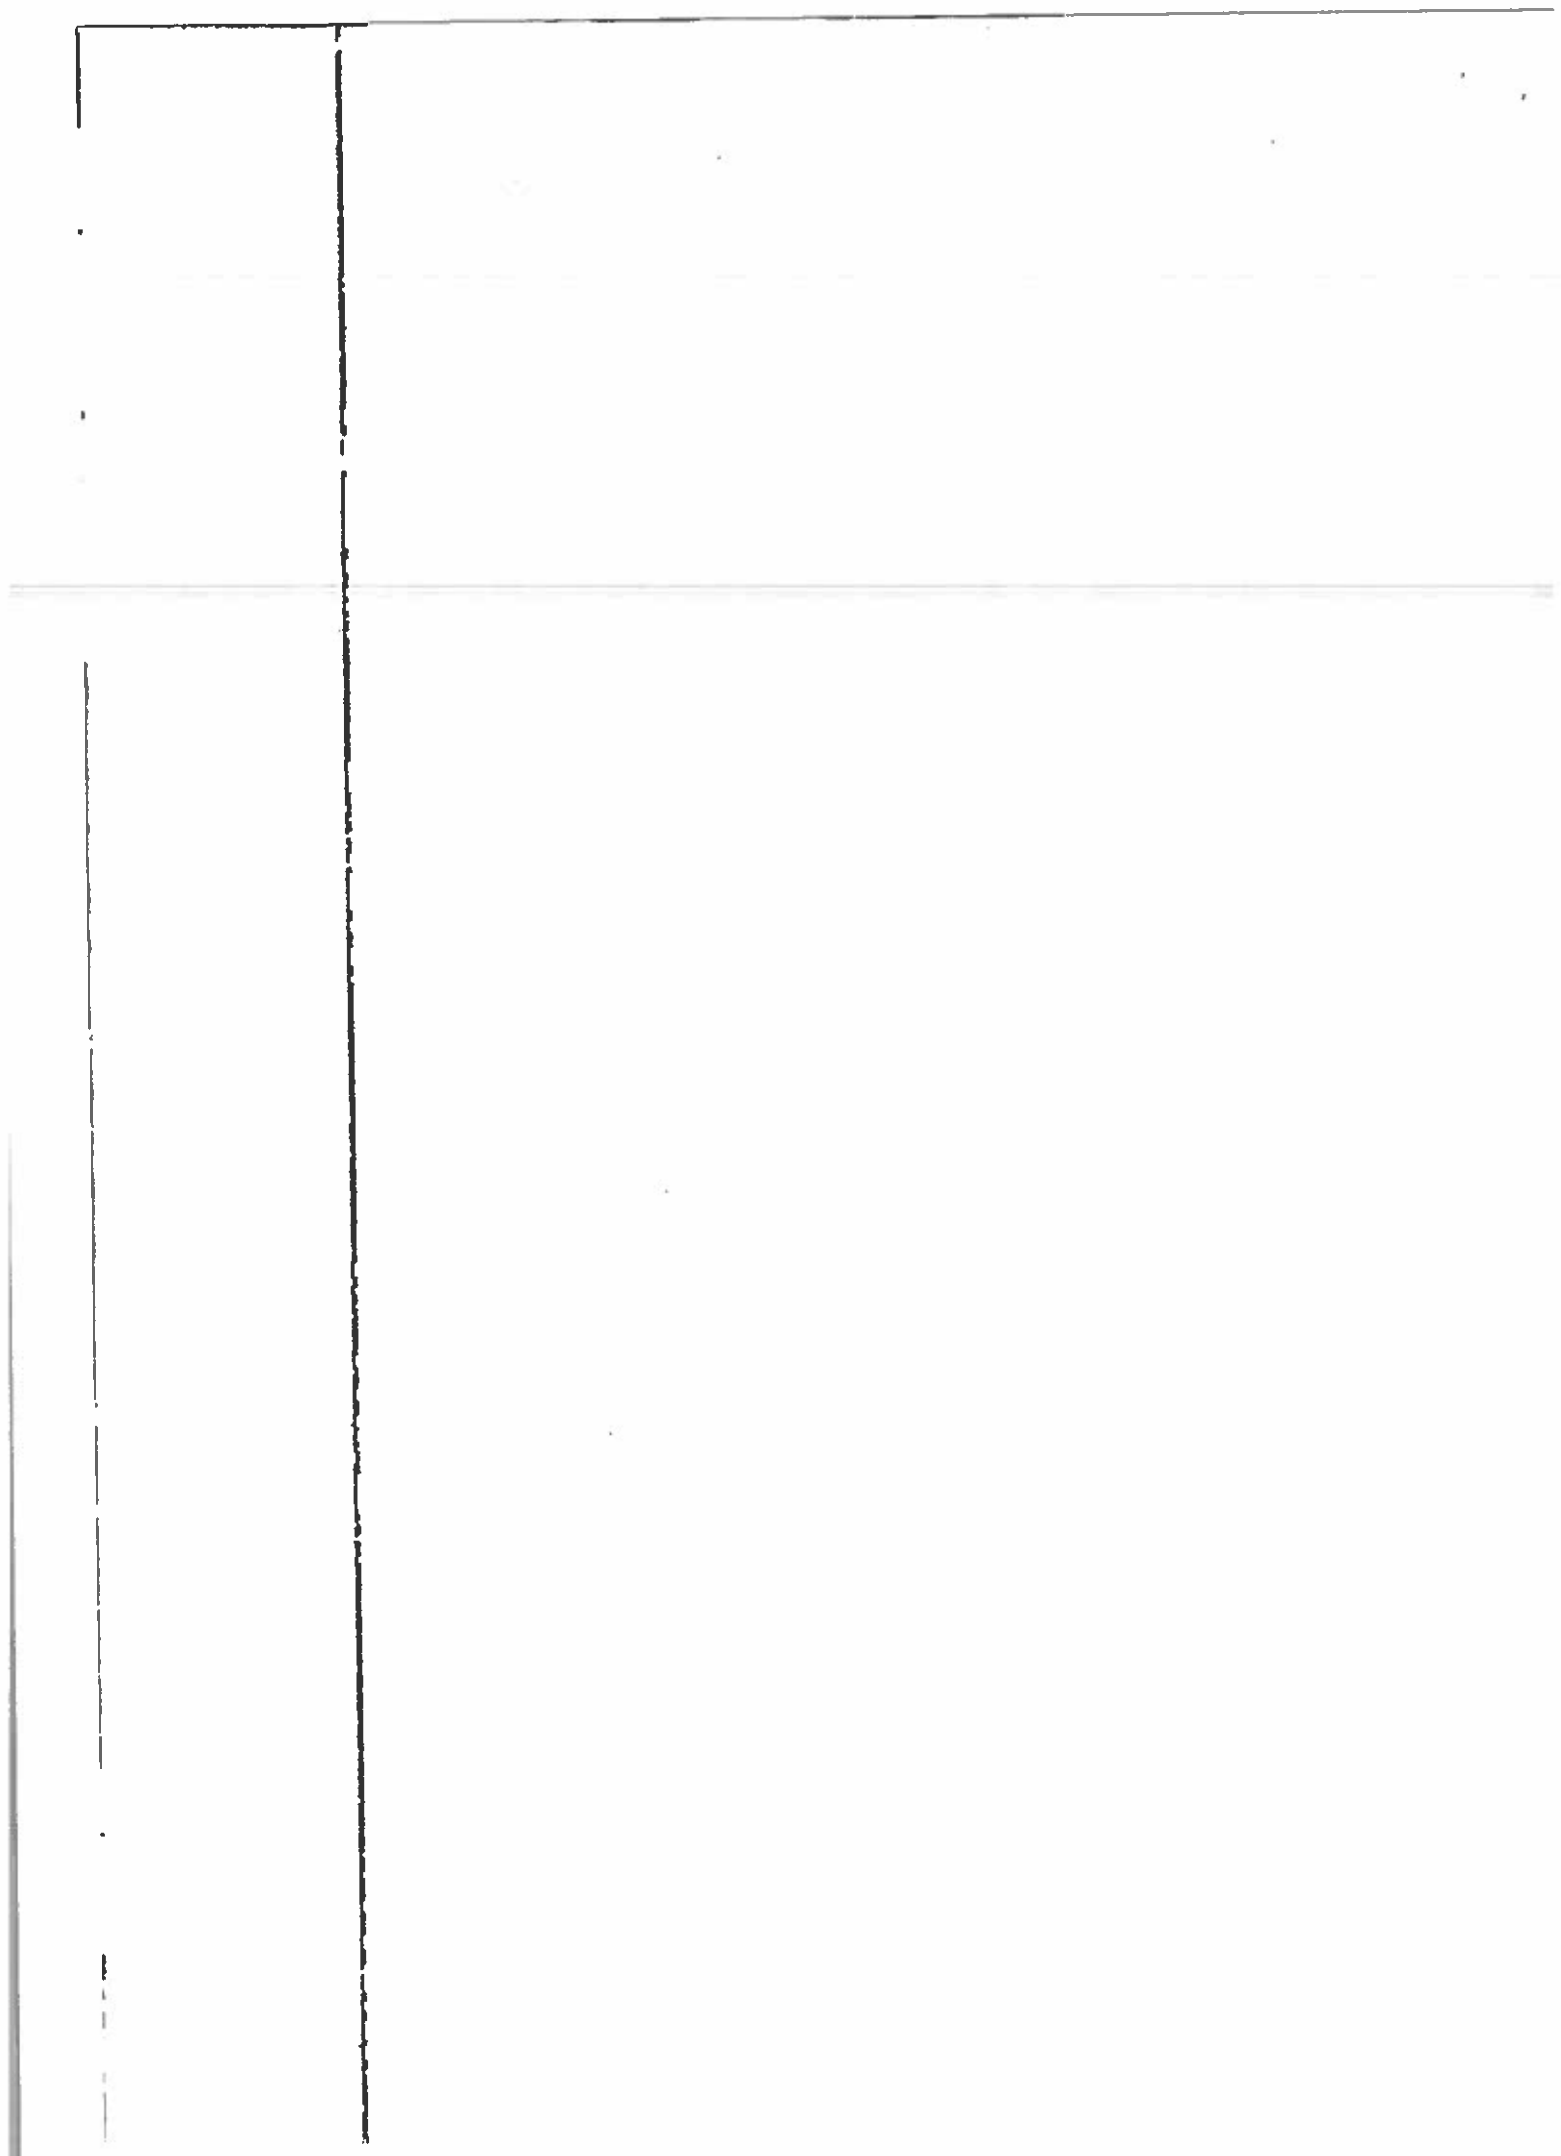

A projekt azonosító száma: TAMOP-5.4.11-12/1-2012-0001

A (fő)kezdvezményezett neve: Fogyné Személyes Esélyegyenlőségért Közhatalmi Nonprofit Koriátolt Felelősségű Társaság

Tevékenységek	Tervezett		Tényleges kezdete	Tényleges megvalósítás	Tevékenység előrehaladásának bemutatása	Eltérés oka és tervezett/megtett lépések
	kezdete	befejezése				
5 Projekt előkészítés	2012.06.28	2013.02.01	2012.06.28	2013.02.01	Miután 2012.06.28. megjelent a kiemelt projekt pályázati felhívása. Megkötésre kerültek a projekt előkészítéséhez kapcsolódó szerződések; kidolgozásra került a projekt megvalósíthatósági tanulmánya és mellékletei. Ebben a részben a részletek.	Nincsen eltérés.
6 Egyéb szolgáltatások költségei	2013.02.01	2015.04.30	2013.02.01	2015.04.30	Az Egyéb szolgáltatások költségeinek felhasználására nem került sor, ezért nem releváns.	Nincsen eltérés.
7 Projekt menedzsment költségei	2013.02.01	2015.04.30	2013.02.01	2015.04.30	Kiválasztásra került a projektmenedzsment a projektvezető: 2013.02.01-2013.04.15-ig az 1. sz. változás-bejelentőben közölték szerint 2013.04.15-től személyében; a pénzügyi vezető: a projekt asszisztens lett. Az Elszámolás az alábbi költségeket tartalmazza: II / 522. sor: Projektmenedzsment irodabérlés költségeit; II / 54. és 56. sor: Projektmenedzsment bér- és járulékok költségeit.	Nincsen eltérés.
8 Célcsoport számára biztosított támogatások	2013.02.01	2015.04.30	2013.02.01	2015.04.30	A Célcsoport számára biztosított támogatás felhasználására nem került sor, ezért nem releváns.	Nincsen eltérés.
9 Projekt megvalósításához igénybevevett szolgáltatások	2013.02.01	2015.04.30	2013.02.01	2015.04.30	Kiválasztásra került a projekt megvalósításáért felelős szakmai vezető: valamint a szakmai stáb elhelyezését biztosító iroda. Az Elszámolás az alábbi költségeket tartalmazza: V / 522. sor: a szakmai megvalósítók irodabérlésének költségeit; V / 529. sor: a szakmai vezető megbízási díjának költségeit.	Nincsen eltérés.



A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.4.11-12/1-2012-0001

A (fő)kezdvezményezett neve: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznu Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

### 2.1. Elvégzett tevékenységek

Tevékenység	Konzorciumi partner neve	Kapcsolódó számla, illetve számviteli bizonylat, összesítő kifizetési kérelem szerinti sorszáma	Teljesítést alátámasztó dokumentum felsorolása	A korábbi IB sorszám köteles	Közbeszerzés
1 Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek	Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznu Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság		Személyi jellegű költségek összesítő táblázata, munkaszerződések, munkaköri leírások, bérlapok, kifizetési bizonylatok.		Nem
2 Tartalék	Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznu Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság		Nem releváns.		Nem
3 Egyéb a projekt megvalósításával összefüggő (általános) költség	Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznu Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság		Általános költségek összesítő táblázata		Nem
4 Beruházás (ERFA)	Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznu Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság		Számla, árajánlat, megrendelés, kifizetési bizonylat, üzembe helyezési jegyzőkönyvek.		Nem
5 Projekt előkészítés	Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznu Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság		eFT-ot nem meghaladó támogatástartalmú számlák összesítője, Számlák, teljesítésigazolások, (megbízási)szerződések, kifizetési bizonylatok, bankszámlakivonat		Nem






A projekt azonosító száma: TAMOP-5.4.11-12/1-2012-0001

A (fő)kedvezményezett neve: Fogvatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznu Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Tevékenység		Konzorciumi partner neve	Kapcsolódó számla, illetve számviteli bizonylat, összesítő kifizetési kérelem szerinti sorszáma	Tejesítést alátámasztó dokumentum felsorolása	A korábbi IB sorszám	Közbeszérvés köteles
6	Egyéb szolgáltatások költségei	Fogvatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznu Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság		Nem releváns.		Nem
7	Projekt menedzsment költségei	Fogvatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznu Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság		3 Ft-ot nem meghaladó támogatástartalmú számlák összesítője; Személyi jellegű költségek összesítő táblázata, munkaszerződések, munkaköri leírások, bértábla, kifizetési bizonylatok.		Nem
8	Célcsoport számára biztosított támogatások	Fogvatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznu Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság		Nem releváns.		Nem
9	Projekt megvalósításához igénybe vett szolgáltatások	Fogvatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznu Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság		Számlák, teljesítésigazolások, kifizetési bizonylatok, szerződések, 3 Ft-ot nem meghaladó támogatástartalmú számlák összesítője.		Nem

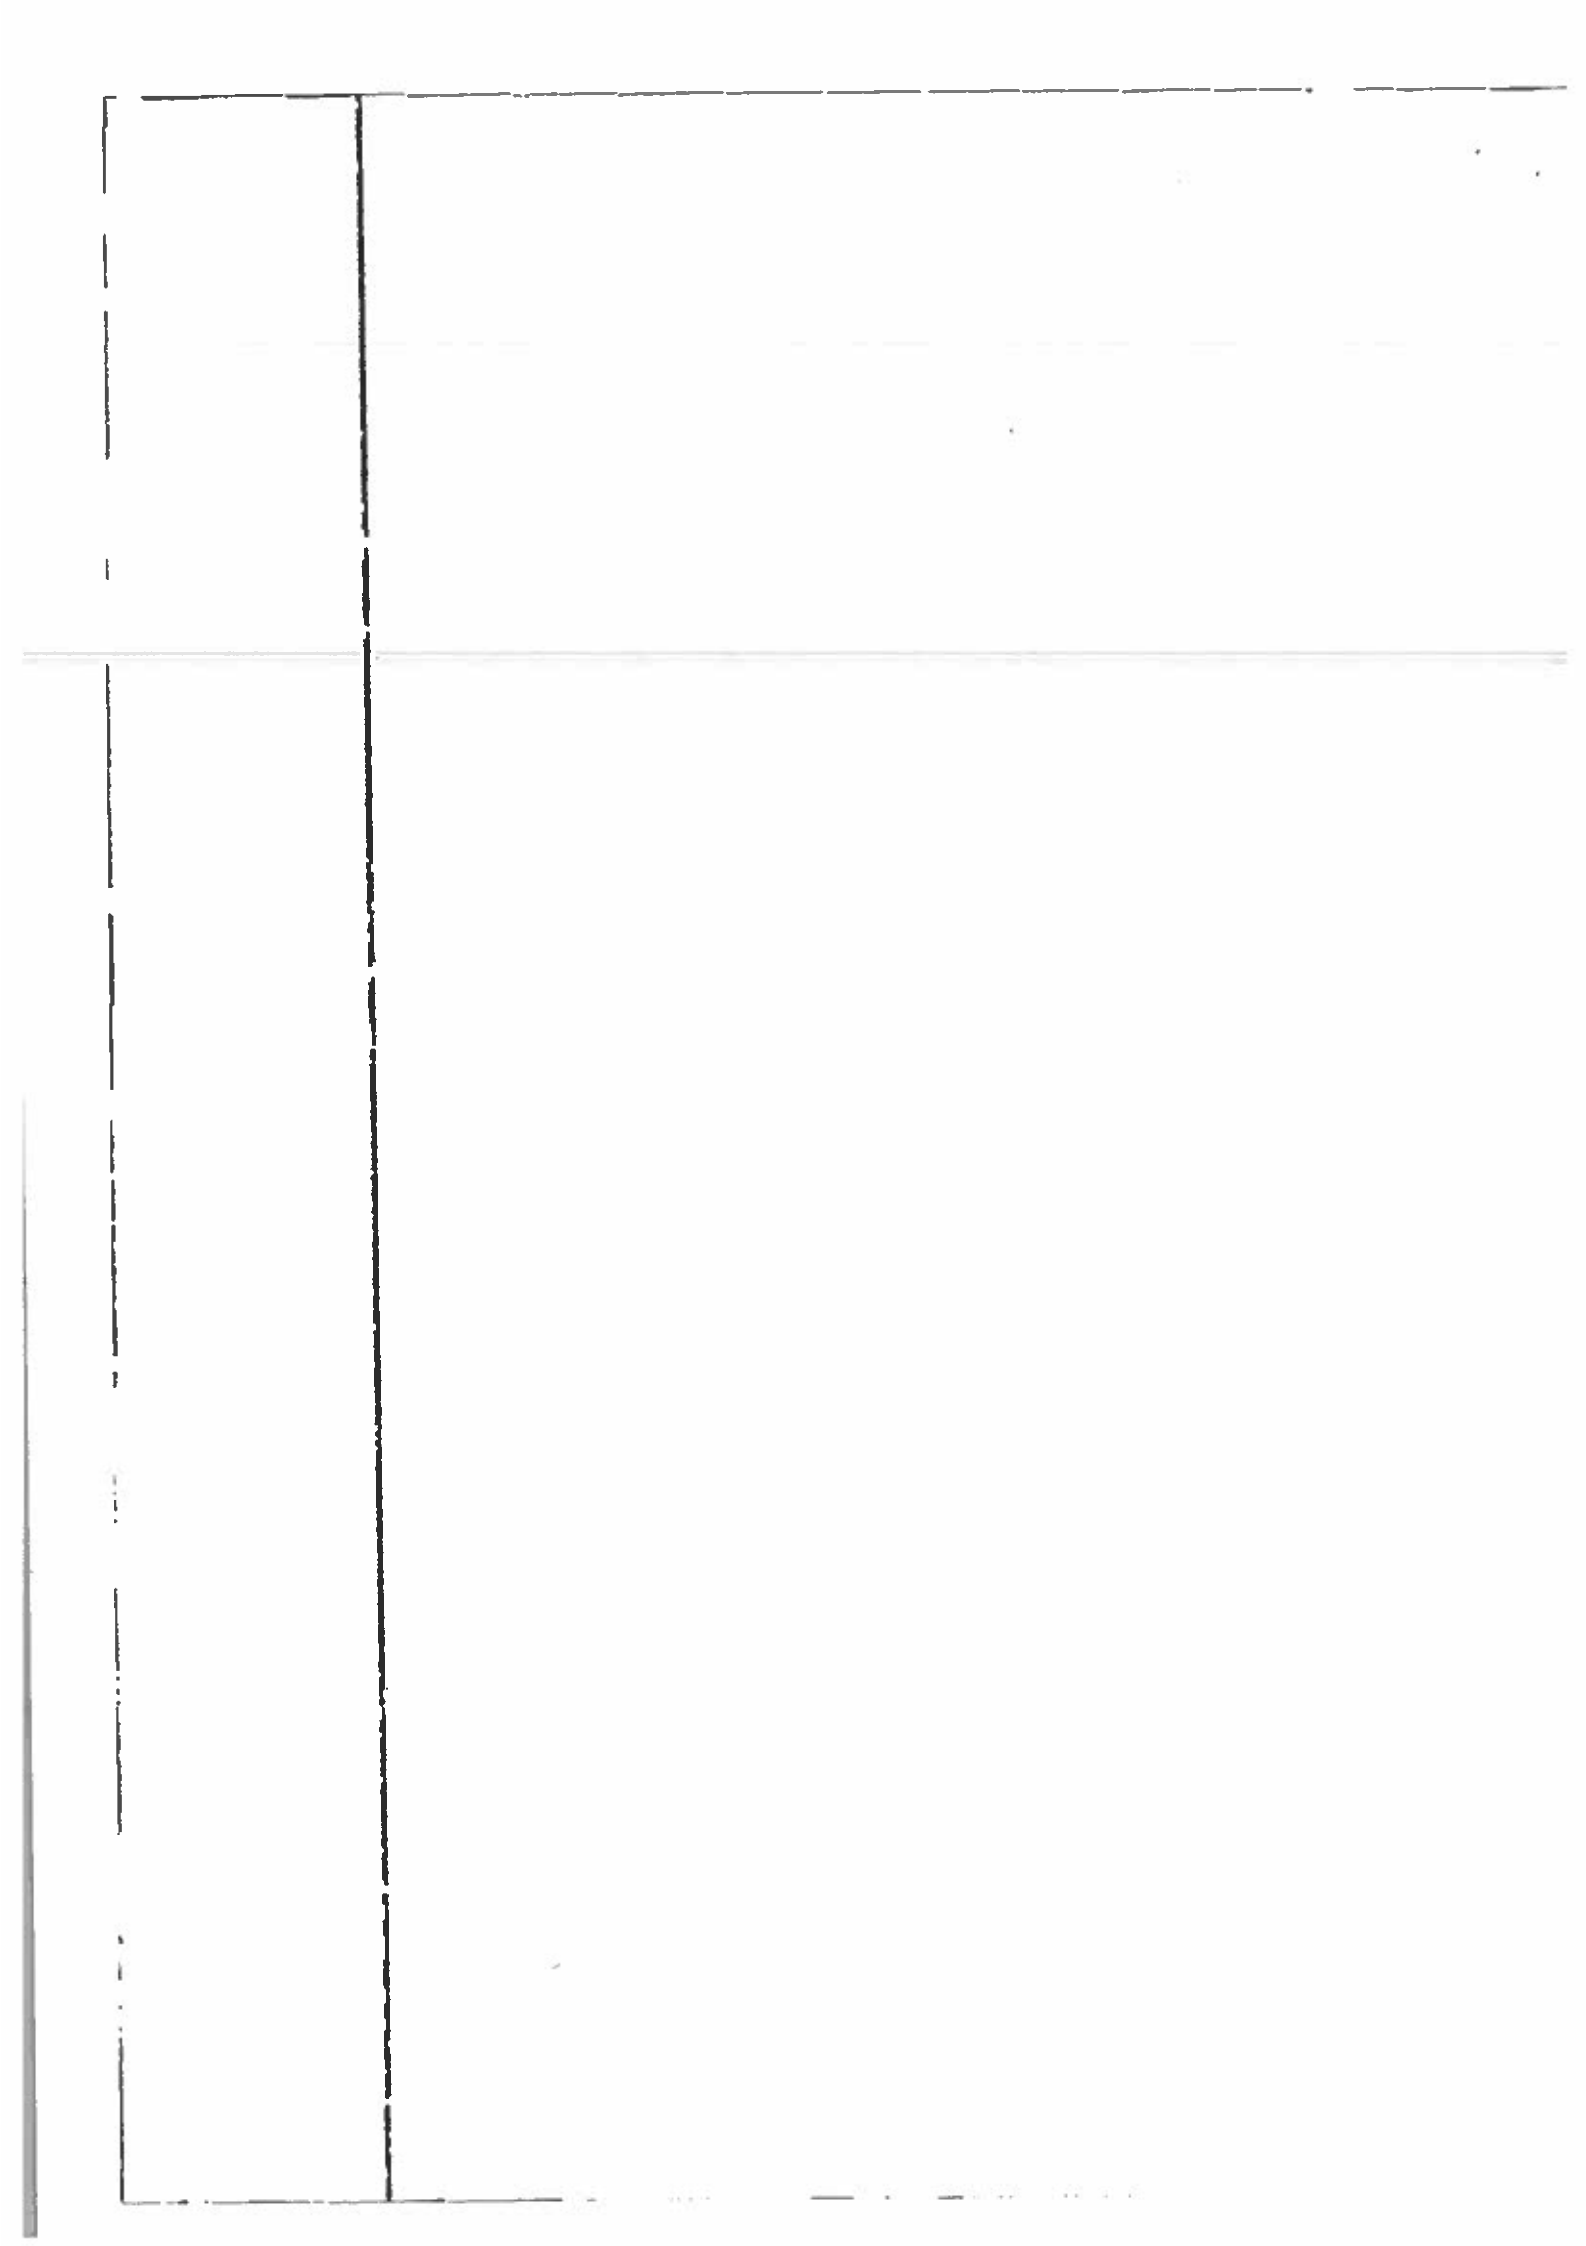

**3. Összefoglaló:**

**KÉRÜK, ADJON RÖVID ÖSSZEFOGLALÓT A JELENTÉSTÉLI IDŐSZAKBAN (VAGY AMENNYIBEN VOLT VONATKOZÓAN IS) A MEGVALÓSÍTOTT TEVÉKENYSÉGEI ELŐREHALADÁSÁRÓL, ELTÉRÉS ESETÉN, ANNAK OKÁRÓL, MEGOLDÁS ÉRDEKÉBEN MEGTETT LÉPÉSEKRŐL.**

**Összefoglaló / Elvégzett tevékenységek**  
 I. Projekt előkészítés költségei:  
 - 2012.06.28.: megjelent a kiemelt projekt pályázati felhívása. Megkötésre kerültek a projekt előkészítéséhez kapcsolódó szerződéses; kidolgozásra került a projekt megvalósíthatósági tanulmánya és mellékletei.  
 2012.08.22.: a megvalósíthatósági tanulmány és mellékletei benyújtásra kerültek az Emberi Erőforrások Minisztériumához a Miniszteri Támogató Nyilatkozat kiadásához. Az ESZA Nonprofit Kft. tisztázó kérdéseire a szakmai válaszok kidolgozásra kerültek; amelyek 2012.11.22. napon kerültek benyújtásra. A projekt támogatására vonatkozó hivatalos értékelés 2012.12.01. napon kelet. 2012. december hónapban a projekt előkészítésével kapcsolatos szerződés az időtartama vonatkozásban módosításra kerültek. Ugyanebben a hónapban került benyújtásra az alapítói határozat kérelme a Támogatási Szerződés aláírásának az engedélyezéséhez. 2012.12.09. napon kelet a projekt akciótervi nevesítéséről szóló kormányhatározat, amely dokumentumok beszerzésre kerültek. A megvalósíthatósági tanulmánya elkészítésében közreműködtek;


II. Projekt menedzsment költségei:  
 - Kiválasztásra került a projektmenedzsment; a projektvezető: 2013.02.01-2013.04.15-ig , majd az 1. sz. változás-bejelentésben közzétett szerint 2013.04.15-től személyében; a pénzügyi vezető: a projekt asszisztens;

III. Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek:  
 - 2013.02.01-től az alábbi humán erőforrás kiválasztására és felkérésére került sor a pályázati útmutató elvársáinak megfellelően: szakmai vezető, témavezetők (4 fő), asszisztensek (3 fő); a Szakmai Irányító Testület tagjai (5 fő). A SZIT elnöke és tagjai:  
 az EMMI képviselőjében, a SZIT elnöke;  
 z érdekvédelmi monitornába delegált személy kijelölését az végzte. A szervezet írásos visszajelzése 2013. 02. 13. napon ügyvezetőjét jelölte meg a feladatok ellátásra.

IV. Célcsoport számára biztosított támogatás (100%):  
 - A Célcsoport számára biztosított támogatás felhasználására nem került sor, ezért nem releváns.  
 V. Projekt megvalósításához igénybevevett szolgáltatások:  
 - 2013.02.01-től az alábbi humán erőforrás kiválasztására és felkérésére került sor a pályázati útmutató elvársáinak megfellelően: szakmai vezető, vezető szakértő. Továbbá sor került a szakmai megvalósítók elhelyezését szolgáló iroda kibérlésére.

VI. Egyéb szolgáltatások költségei:  
 - Az Egyéb szolgáltatások felhasználására nem került sor, ezért nem releváns.  
 VII. Beruházás (ERFA):  
 - A projekt megkezdéséhez szükséges legfontosabb eszközök és bútorok beszerzése megtörtént. Az IKT eszközök közül: 10 db Notebook 3 db Tablet 10 db Egér 6 db Mobil telefon ( ); a bútorok közül: 4 db íróasztal, 2 db tárgyaló asztal, 10 db tárgyaló szék, 8 db fiókos elem, 5 db írártatói szekrény beszerzésére került sor.

VIII. Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség:  
 - Az alábbiak kiszámlázásra kerül sor: VIII/513. sor: a legszükségesebb irodaszerek beszerzésének költségei; VIII/527. sor: Posta, telefon, fax, internet költségek; VIII/529. sor: A mellékelt Arányosítási Módszerben foglaltak szerinti rezi költségek; VIII/531. Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak: a Magyar Allamkincstár elküldött számlavezetési költség.  
 Tartalék: a Tartalék felhasználására nem került sor, ezért nem releváns.

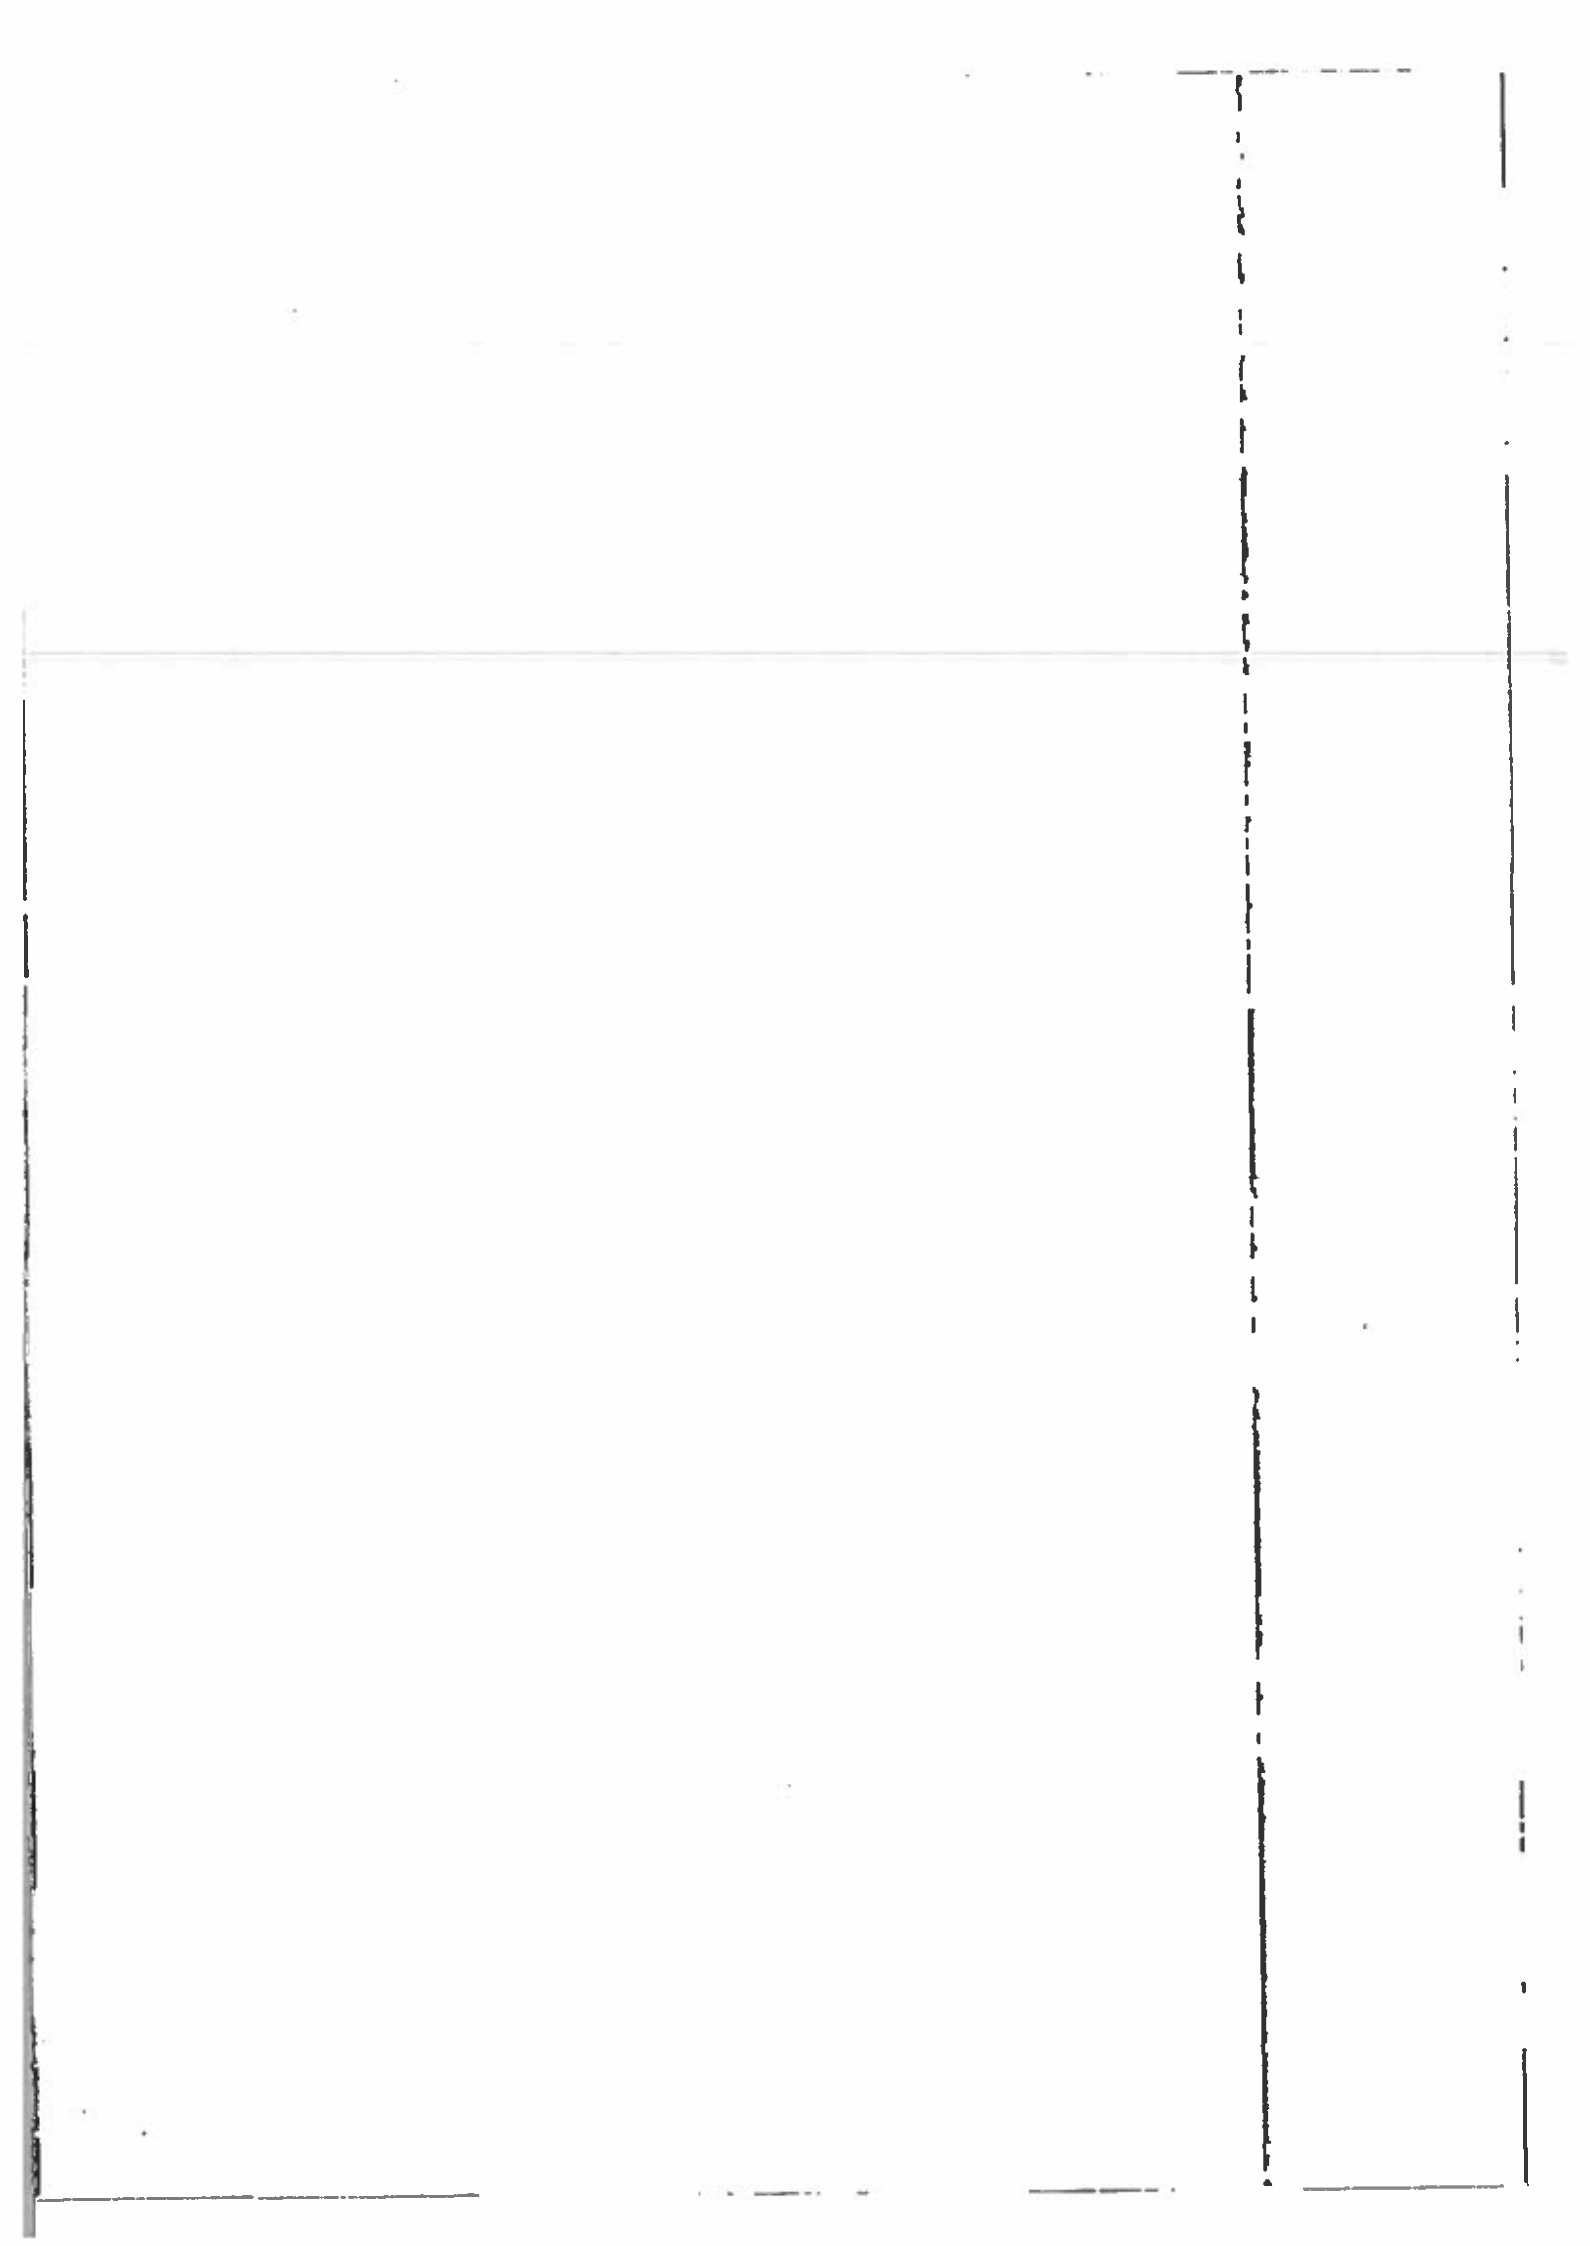


A projekt azonosító száma: TAMOP-5.4.11-12/1-2012-0001

A (fő)kezdvezményezett neve: Fogytékos Személyek Esélyegyenlőségért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társ

**SZÉCHENYI TERV**




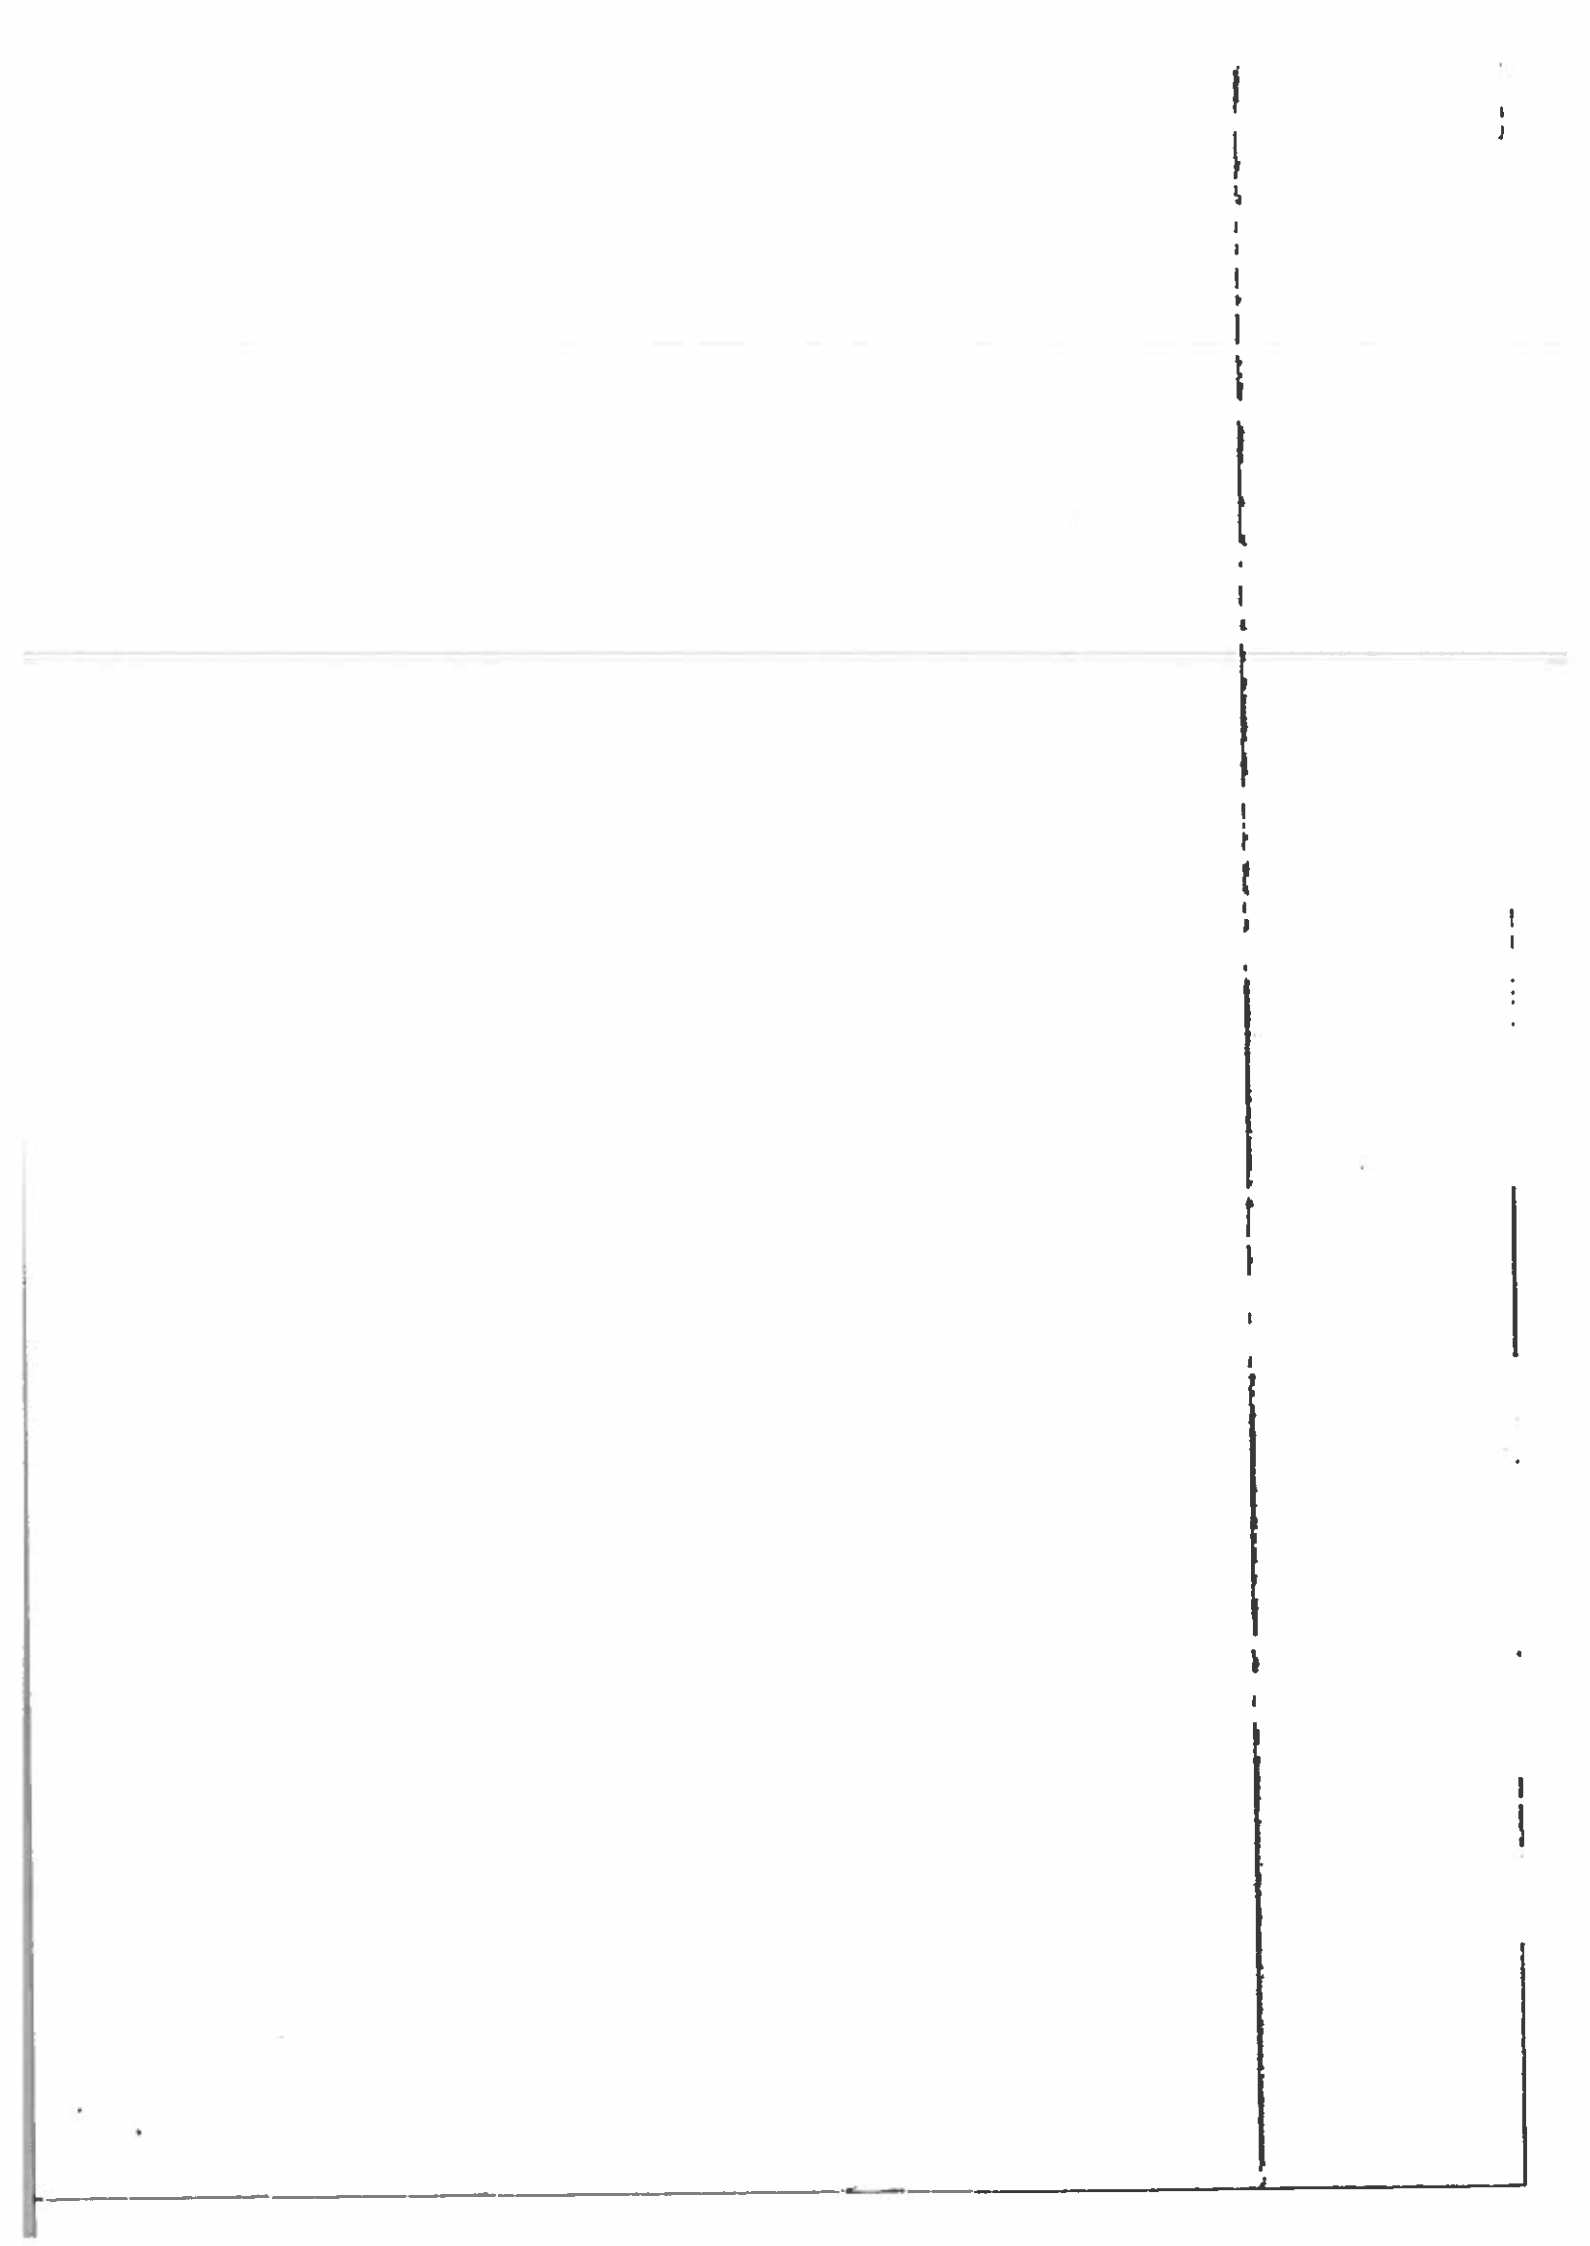

**4. Indikátorok**

1. A kompetenciafejlesztésben résztvevők száma (fő)				
Terven kívüli tényadat:	Bázis nem értelmezhető	Tényérték dátum: 2013.04.30	Összes változás: 0	Eldő beszámolóban szereplő "Összes változás":
2. Akkreditált képzési programok száma (db)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: 2	Tényérték dátum: 2013.04.30	Bázis + össz. változás: 2	Eldő beszámolóban szereplő "Bázis + össz. változás":
3. Autizmus-specifikus szolgáltatási követelményrendszer (db)				
Terven kívüli tényadat:	Bázis nem értelmezhető	Tényérték dátum: 2013.04.30	Összes változás: 0	Eldő beszámolóban szereplő "Összes változás":
4. Autizmus-specifikus szolgáltatási követelményrendszer szerint működő bázisintézmények (db)				
Terven kívüli tényadat:	Bázis nem értelmezhető	Tényérték dátum: 2013.04.30	Összes változás: 0	Eldő beszámolóban szereplő "Összes változás":
5. Az akkreditált képzéseken résztvevők száma (fő)				
Terven kívüli tényadat:	Bázis nem értelmezhető	Tényérték dátum: 2013.04.30	Összes változás: 0	Eldő beszámolóban szereplő "Összes változás":
6. Az akkreditált képzéseket sikeresen elvégzők száma (fő)				
Terven kívüli tényadat:	Bázis nem értelmezhető	Tényérték dátum: 2013.04.30	Összes változás: 0	Eldő beszámolóban szereplő "Összes változás":
7. Országos Autizmus Koordinációs Központ (db)				
Terven kívüli tényadat:	Bázis nem értelmezhető	Tényérték dátum: 2013.04.30	Összes változás: 0	Eldő beszámolóban szereplő "Összes változás":

**4.1. Indikátor eltérés magyarázat**

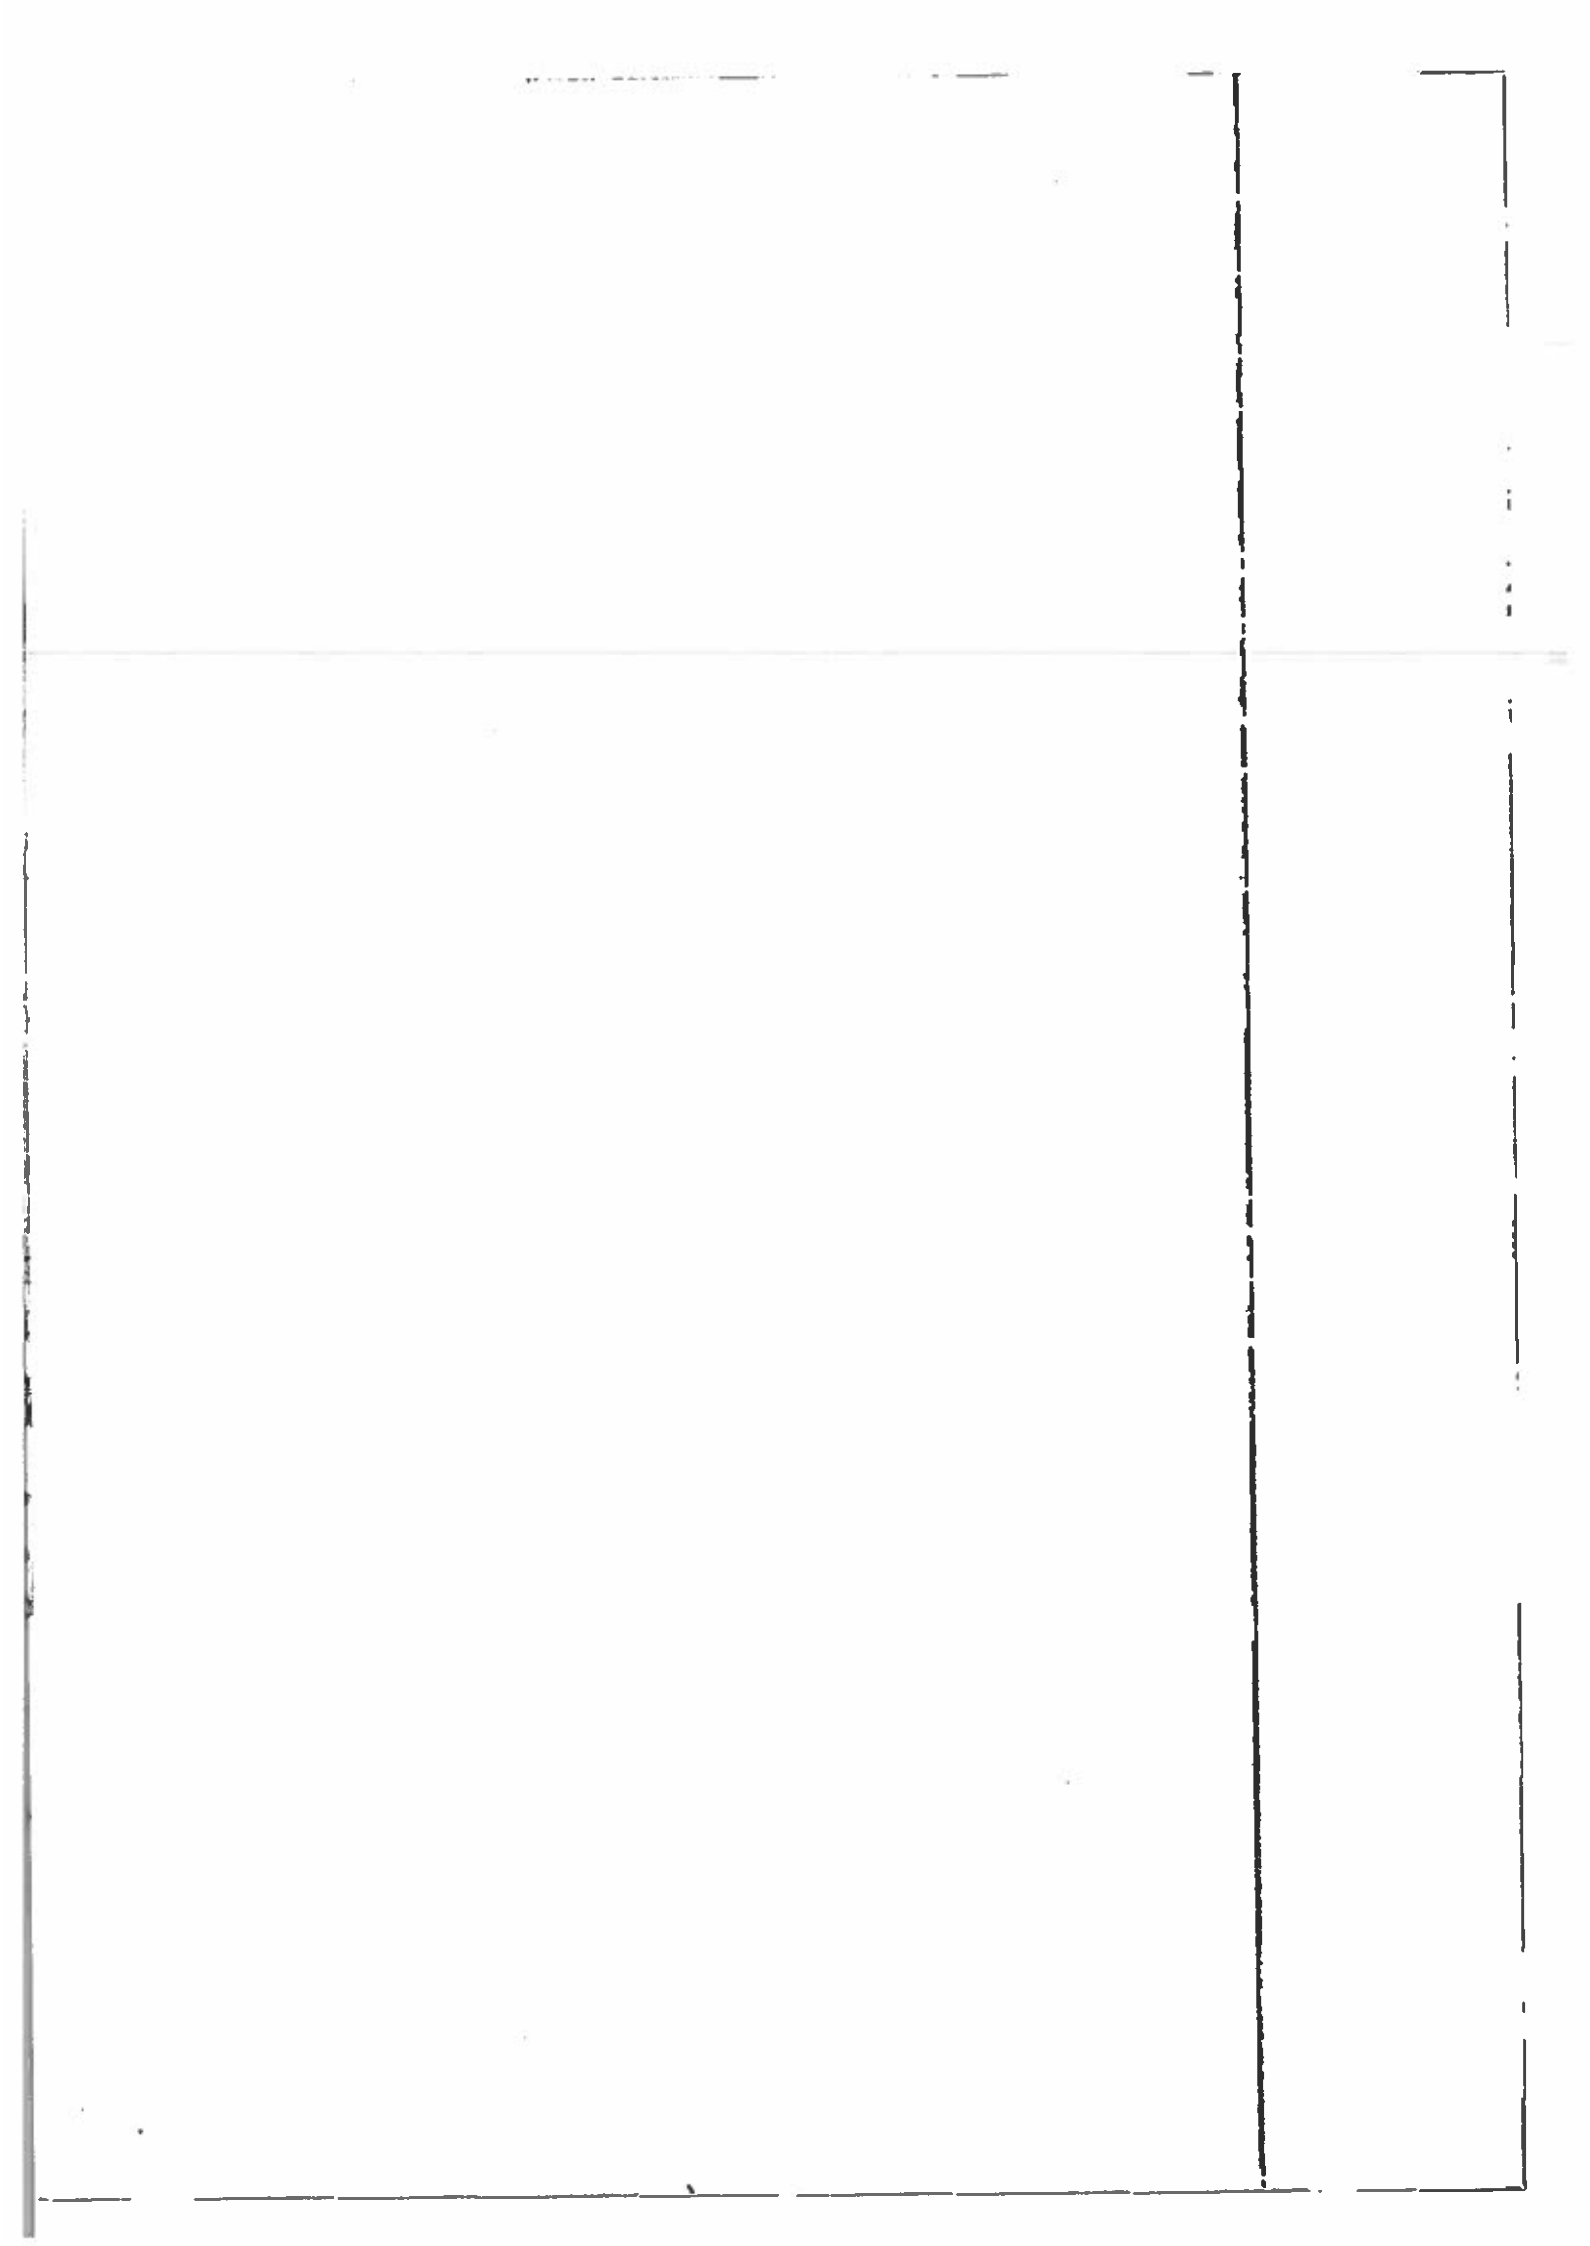



**Indokolja, ha a célok teljesülésében eltérés mutatkozik a tervekkel:**  
Az indikátorok tekintetében nem mutatkozik eltérés, ezért nem releváns.

A projekt azonosító száma: TAMOP-5.4.11-12/1-2012-0001  
A (fő)kezdvezményezett neve: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhatalmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társ





Utolsó módosítás:	2013.05.22 16:01:02
Végleges mentés:	2013.05.22 16:04:22
PDF fájl generálás:	2013.05.22 16:06:31

(fő)kedvezményezett, vagy a  
 Fogyműködés Személyek  
 Esélyegyenlőségért  
 Közhatalmi Nonprofit Kft.  
 Adószám: 23808689-1-41  
 1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6.

Kelt: .....

Alulírott, mint a projektet megvalósító (fő)kedvezményezett, bűnteljesítési kötelezettségeim teljes tudatában nyilatkozom:

- a beszámolóban megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelelő;
- a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok a helyszínen elküldött dokumentumok alapján nyilvántartva;
- a közbeszerzéssel érintett tevékenységek kapcsán, a közbeszerzések lefolytatása során a 4/2011. (I. 28.) korm. rendelet 23. c. pontjában meghatározott Szervezeti és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség közbeszerzési Felügyeleti Főosztályát az abban foglaltaknak megfelelően tájékoztattam, a tevékenységük végzéséhez szükséges dokumentumokat részükre beküldtem, illetőleg ezen szervezetekkel együttműködöm;
- a helyszíni ellenőrzések során készített jegyzőkönyvben vállalt kötelezettségek megtételéről gondoskodom;
- a tájékoztatásra és nyilvántartásra vonatkozó kötelezettségeket betartom és a tájékoztatással és a nyilvántartással kapcsolatos, támogatási szerződésben illetve támogatási okiratban vállalt kötelezettségekre elegendő tesztek.

NYILATKOZAT

A projekt azonosító száma: TAMOP-5.4.11-12/1-2012-0001

A (fő)kedvezményezett neve: Fogyműködés Személyek Esélyegyenlőségért Közhatalmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társ

SZÉCHENYI TERV



