

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött
egyrésről:

Név: **Kalocsa Város Önkormányzata**

Cím: 6300 Kalocsa, Szent István kir. út 35.


mint megrendelő/ továbbiakban megrendelő/

másrésről:

DOBOS BETON-ÚT Kft.

6300 Kalocsa zöldfa u. 32.

mint vállalkozó/ továbbiakban vállalkozó/ között az alábbiak szerint:

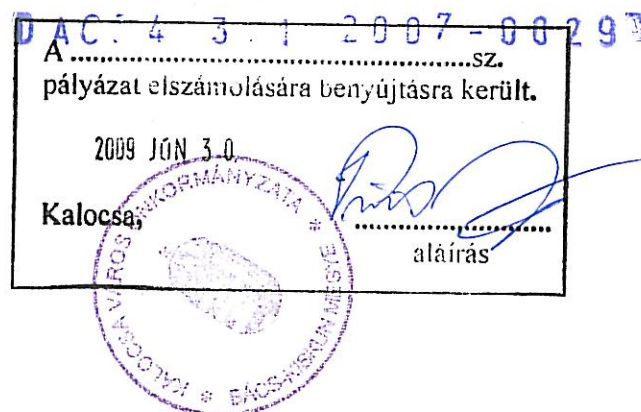

1. A szerződés tárgya:

Kalocsa, Kórház-Rendelőintézet akadálymentesítése DAOP-4.3.1-2007-29 számú pályázat részét képező, a főbejárati portától a most épülő lift bejáratáig kiépítendő aszfalt járda és parkoló bontási és építési munkáinak kivitelezése.

2. A szerződés díja:

A Vállalkozó vállalja, hogy az általa megadott és a Megrendelő által elfogadott összegű díjért **Bruttó (Áfa 20%) 1.159.931 Ft** – ért azaz egymillió-egyszázötvenkilenezer-kilencszázharmincegy forintért az elvállalt munkát elvégzi.

3. A kivitelezés egészére a költségszámítás előzetesen felmért adatokat tartalmaz. A költségszámítás szabad árformában készült.

4. A Megrendelő kijelenti, hogy ezen szerződésben leírt munka elvégzéséhez szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre áll.

5. A Megrendelő a munkavégzéshez szükséges munkaterületet a Vállalkozónak munkavégzésre alkalmas állapotban 2009. február 04.-ig átadja.

6. A szerződés műszaki teljesítésének határideje: 2009. április 15. A Vállalkozó jogosult a szerződésben megállapított határidő előtt is teljesíteni.

7. A Megrendelő műszaki ellenőre:

Név: ÉPINBER Kft.

Cím: 6000 Kecskemét Csányi J. krt. 12.

DACT4.3.1-2007-0029

8. A Vállalkozó műszaki vezetője:

Név: Dobos Róbert

Cím: Kalocsa Gém u. 1.

9. A kivitelező a költségvetést egyösszegű fix áron készítette.

10. A Megrendelő a Vállalkozó számlakövetelését a műszaki átadás - átvétel napjától számított – azt a napot is magába foglaló 60 napon belül teljesíti.
A Megrendelő fizetési késedelem esetén késedelmi kamatot fizet, melynek összege a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.

11. A szerződés tárgyát képező munkák építési, fenntartási jelleggel készülnek. Az érvényben lévő építési és fenntartási szabályok, műszaki leírások alapján jár el a vállalkozó.

12. A kivitelezés során felmerült többlet és pótmunkát a Vállalkozó csak a megrendelő cégszerűen aláírt megrendelésére végzi el.

13. A munkálatok befejezését a megrendelő az átadás – átvételi jegyzőkönyvben rögzíti.

14. A munkák egyes részeit a Vállalkozó az ajánlattól eltérően a Megrendelő e szerződésben rögzített engedélye alapján végeztetheti alvállalkozóval.

15. A Vállalkozó a munkát I. osztályú minőségben végzi el, és 3 év teljes körű jótállást vállal.

16. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a megrendelő által a vállalkozó rendelkezésére bocsátott tervben nem szereplő vagy ezen kívül megrendelő által át nem adott, vagy nem jelzett közművekben okozott kár és annak következményei nem terhelik a vállalkozót.

17. A felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos Ptk. egyéb rendelkezéseit tekintik irányadónak.

18. A felek a szerződést elolvasása után – mint akaratukkal mindenben megegyezőt – elfogadják és aláírják.

Kalocsa 2009. február 03.



megrendelő



DOBOS BETON - ÚT KFT.
6300 Kalocsa, Zöldfa u. 32.
Adószám: 11972772-2-03
Banksz: 50500150-11001490


vállalkozó

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről


Kalocsa Város Önkormányzata (6300 Kalocsa, Szent István kir. út 35.) mint **megrendelő**,
másrészről


Dobos Beton-Út Kft (6300 Kalocsa, Zöldfa u. 32.) mint **vállalkozó**


között, az alábbiak szerint:

1. A szerződő felek 2009. február 3-i dátummal vállalkozási szerződést kötöttek a Kalocsa, Kórház-Rendelőintézet külső akadálymentesítése tárgyában, mely a DAOP-4.3.1-2007-29 számú pályázat részét képező feladatokra vonatkozott.
2. A megrendelő vállalta, hogy 2009. február 4-ig a vállalkozó részére munkaterületet biztosít, azonban a téli időjárás miatt az épület bővítés és felvonó munkálatai elhúzódtak, ezért a munkaterületet csak legkorábban 2009. április 15-ével lehet birtokba venni. Ebből kifolyólag a szerződés 6.) pontjában szereplő vállalkozási határidőt a felek kölcsönösen 2009. május 20-ra módosítják.
3. A megrendelő a műszaki ellenőr és a közreműködő rehab mérnök előrejelzése alapján kényszerül műszaki szükségességből pótmunkák elrendelésére a külső akadálymentesítési munkák végzése kapcsán, ennek előirányzati összege nettó 250.000,- Ft. Ezt felhasználni csak a műszaki ellenőr által építési naplóban történő elrendelést követően lehet, a szerződésben rögzített egységáron, utólagos felméréssel. Fentiek alapján a vállalkozási díj a tartalékkerettel növelve bruttó 1.459.931,- Ft-ra módosul.
4. A vállalkozó a hatályos ÁFA törvény szerint nettó módon jogosult számlát benyújtani. A szerződésben rögzített egyéb feltételek változatlanul érvényben maradnak.
5. A szerződés módosítást a felek kölcsönös érdekből vezérelve és a hatályos Ptk. szerint kötik.

Kalocsa, 2009. március 19.


.....
Megrendelő







DOBOS BETON - ÚT KFT.
6300 Kalocsa, Zöldfa u. 32.
Adószám: 11972772-2-03
Banksz: 50800159-11001490

.....
Vállalkozó

DAOP-4.3.1-2007-29 SZ. pályázat elszámolására benyújtásra került.


Kalocsa,
2009. JUN 3 0


.....
aláírás
